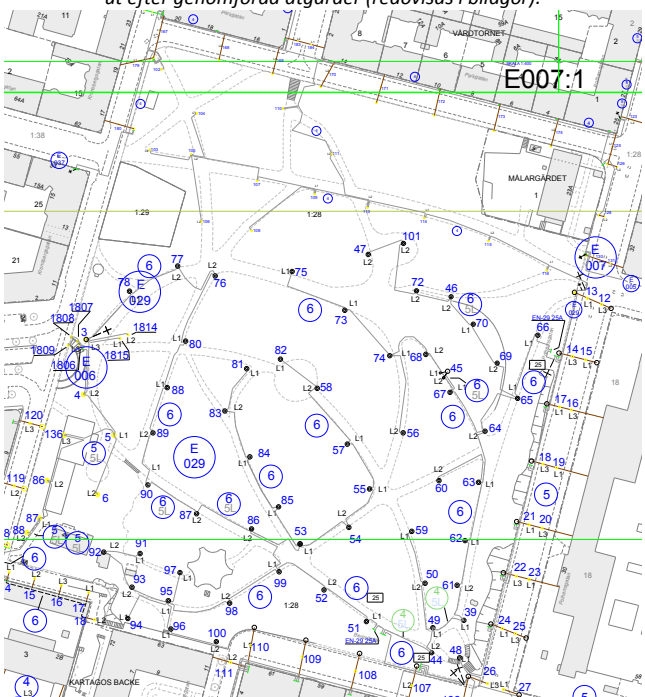


	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2015-12-06
		Bilaga: - Datum: -

Projektnamn: Kabel-, stolp- och armaturbyte i Kronobergsparken Adress: Kronobergsparken - Innerstaden Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor). 
8001892 H8000347	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-10-16	Anders Avemar	600 000 Kr		600 000 Kr
ev. rev. gnmf.beslut					
Slutredovisning	Datum 2016-01-13	<i>Namn</i> teckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr	<i>Namn</i> förttydligande	kr	kr	Kr
	493 553 Kr	Per-Erik Wikström		-106 447 Kr	

ev. beslut på	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i)	För åtgärder på kort sikt	För projektet som helhet
---------------	-----------------------	--	---------------------------	--------------------------

högste beslutsnivå		den grå rutan och välj rätt alternativ)	(utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende.

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering				X																
Entreprenad				X																

Projektsansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		
Ansvarig:	Projekteringsskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus
Ansvarig:	Entreprenadskede	Marika Andersson	Anläggning, Gator&Ljus

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:
Program, gata:		Trafikdrift:
Projektering, park:		Konstbyggnad:
Projektering, gata:		Upplåtelse:
Entreprenad:		Tillgänglighet:
Belysning:	Marika Andersson	Stadsdelsförvaltning:
Signal:		
Övriga:		
Projektet är samordnat med:		

Måluppfyllelse

Projektet innefattar att slutföra upprustningen inom parken genom armaturbyten samt kompletterande kabelbyten. Gammal belysningskabel utbytt till ny 5-ledarkabel samt 46st armaturer och 7st stolpar bytta inom parkområdet.

Kommentarer om övriga erfarenheter

Teknisk lösning:	46 st armaturer med tidigare 125 W kvicksilverlampor är utbytta till nya armaturer med 42W kompaktlysrör.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	
Miljökonsekvenser:	
Riskhantering:	
Ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	Befintliga kabelskyddsror kunde användas för att dra ny belysningskabel i, därmed utgick en större del av den planerade schakten för kabelbytet.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Energikostnader minskar med ca 15 000 Kr per år för anläggningen genom att armaturer med lägre effekt har blivit utbytta.
Övrigt: (genomförandetid, info mm)	
