



## Slutredovisning

<b>Upprättad av</b>	Linnea Svärd
<b>Godkänd av</b>	
<b>Datum</b>	2022-12-29
<b>Projektnamn</b>	VÄGVISNINGSSKYLTL 2022 för Trafikplaneringsavdelningen
<b>Projektnummer</b>	8005151

<b>Adress</b>	
<b>Stadsdel</b>	Flera stadsdelsnämnder

<b>Syfte och avgränsning</b>	Projektet har hand om löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från trafikplaneringsavdelningen under 2022. Projektet syftar till att ta hand om, uppdatera och komplettera all vägvisning allteftersom gaturummet förändras.
------------------------------	---

<b>Projektets åtgärder</b>	De främsta åtgärderna är att säkerställa att vägvisningen längsmed stadens gator är korrekt utifrån de vägvisningsplaner som tagits fram på kontoret under 2010-talet. Under 2022 färdigställdes vägvisningsplaner för stadens yttre delar. Det innefattar både kontroll av skyltar innan nya beställs om de t.ex. körts på, och löpande uppdatering och korrigering av datamaterial i interna databaser där skyltkort sparas. Även justering av skyltar vid t.ex. nybyggnationer ingår.
----------------------------	--



## Slutredovisning


Bilder före

Ex: Vägvisning för turister till turistmål ingick i projektet 2022.



Bilder efter

Ex: Vägvisning för turister till turistmål ingick i projektet 2022.

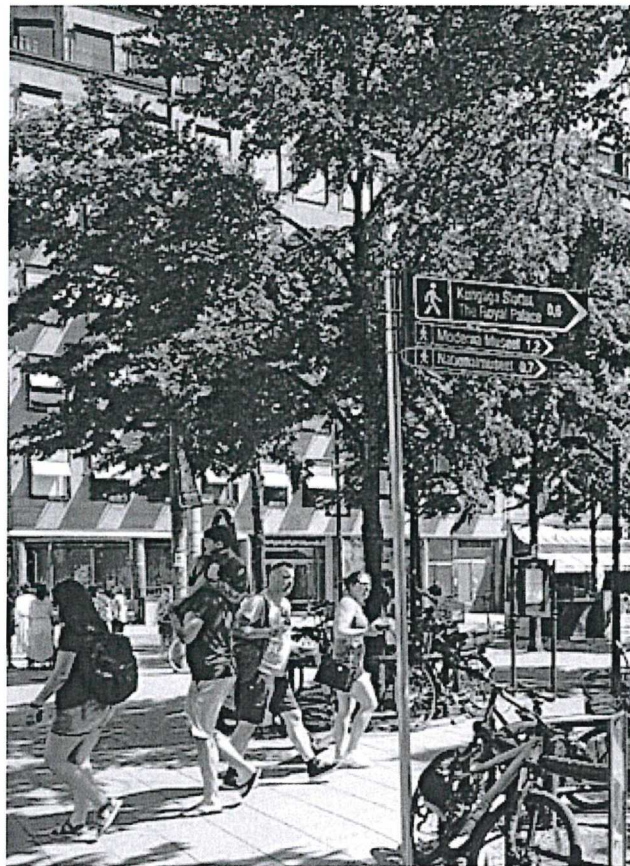



<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Arbetet med att föra in den färdigställda vägvisningsplanen för stadens yttre delar i stadens interna datasystem har försenats och planeras att genomföras under 2023.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall</b>	Projektet hade 1 000 000 kr i genomförandebeslut och nu redovisas det vara ca 850 000 kr kvar i projektet.  Det är en avvikelse i projektet eftersom översynen av vägvisningen för biltrafik i Västerort och Söderort har blivit försenad på grund av att man har upptäckt flera fel i vägvisningen.

<b>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</b>			
Namn		Datum	2023-01-19

