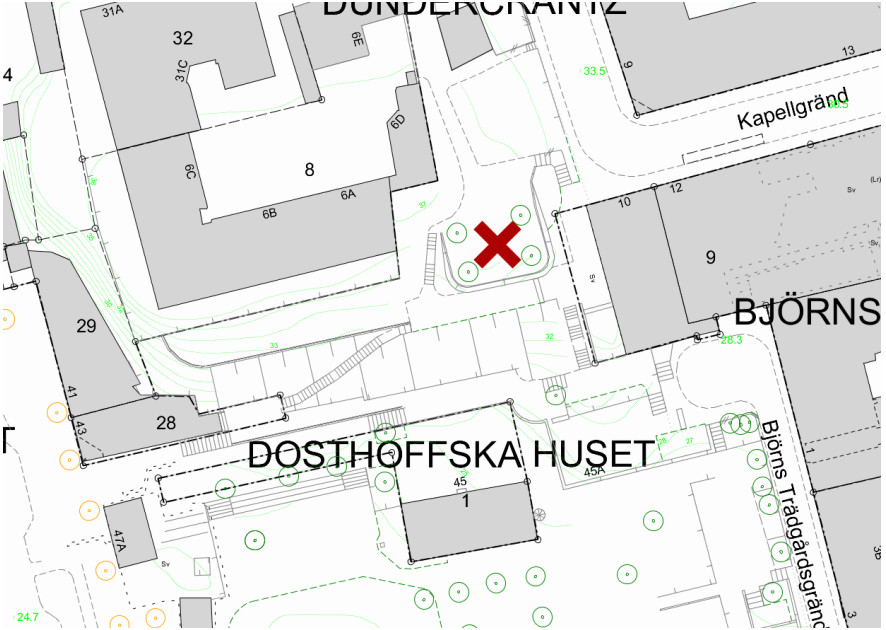


# Bilaga 12

## Uppföljning av trygghetsinvestering

<p><b>Projektname</b></p>	<p>Upprustning av delar av Björns trädgård</p>
<p><b>Geografisk plats för investering</b></p>	<p>Björns trädgård vid Kapellgränd</p>
	
<p><b>Projektets mål och syfte</b></p>	<p>Projektet utgörs av del 1-3 vilka har sina respektive mål och syften. Del 1 är hittills genomförd och del 2 och 3 planeras genomföras under 2019.</p> <p><u>Del 1. Översta terrassen i Björns trädgård mot Kapellgränd</u> Syftet med insatsen var att skapa en attraktiv utsiktsplats med vy över parken genom följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se över markytorna</li> <li>- Se över befintliga träd och ta bort dåliga träd och ersätta dem med nyplantering av körsbärsträd.</li> <li>- Placera ut nya bänkar med ny placering för picnic och lunch.</li> <li>- Smycka platsen med blomsterurnor.</li> </ul> <p><u>Del 2. Slänten vid trappan upp mot moskén</u> Tillföra platsen en extra attraktiv blomsterplantering genom en tät och anslående plantering av blomsterlökar i slänten. Översyn av buskage.</p>

Del 3. Konstgräsyta på nuvarande gräsyta i parkens västra del mot Götgatan

Syftet är att utöka parklekens aktivitetsytor så att parkleksverksamheten flyttas ut i parken. Den befintliga idag nedsänkta gräsytan i parken höjs upp i nivå med övriga lekparksytor för ökad tillgänglighet, och kläs med konstgräs. Därmed kan ytan involveras i parkleken och användas i större utsträckning av fler grupper av användare.

## Slutredovisning

<p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p>	<p>Den översta terrassen i Björns trädgård har erhållit en prydligare och mer inbjudande gestaltning i enlighet med målsättningen. De planerade blomsterurnorna kommer att placeras ut till våren. Genomförda åtgärder har tillsammans med den tillkommande parkbelysningen inneburit att en ny mötesplats skapats vilket sannolikt kommer att öka den upplevda tryggheten.</p>
<p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>	<p>Del 2 och 3 har ännu inte kunnat genomföras vilket beskrivs nedan:</p> <p>Del 2: Det finns en framtagen skiss/illustration över hur slänten kan förses med perenna växter. Syftet med planteringen är att skapa en trivsammare plats med växter. Från början var projektet tänkt att genomföras 2018 men på grund av budgetskalet flyttades projektet till 2019.</p> <p>Del 3: Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att avvakta med att anlägga konstgräsytan i väntan på miljöförvaltningens rekommendation för konstgräs, gummigranulater och platsguten gummi. En projektering av åtgärden är genomförd.</p>
<p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b></p>	<p>Erhålla medel: 2,5 mnkr</p> <p>Upparbetade medel under 2018: 1,0 mnkr</p> <p>Avvikelse: + 1,5 mnkr (överföring av dessa medel till 2019 begärs i verksamhetsberättelsen 2018)</p>

**Bilder  
före**

*Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*



**Bilder  
efter**

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

