

Upprättad av	Lydia Storakaas
Datum	2019-12-11
Projektnamn	Trafiksäkerhet, Fruängsskolan
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8002856

## Slutredovisning

### Bilder före

#### Fruängsgatan och Elsa Brändströms gata






**Vantörsvägen**



Bilder efter

**Fruängsgatan och Elsa Brändströms gata**



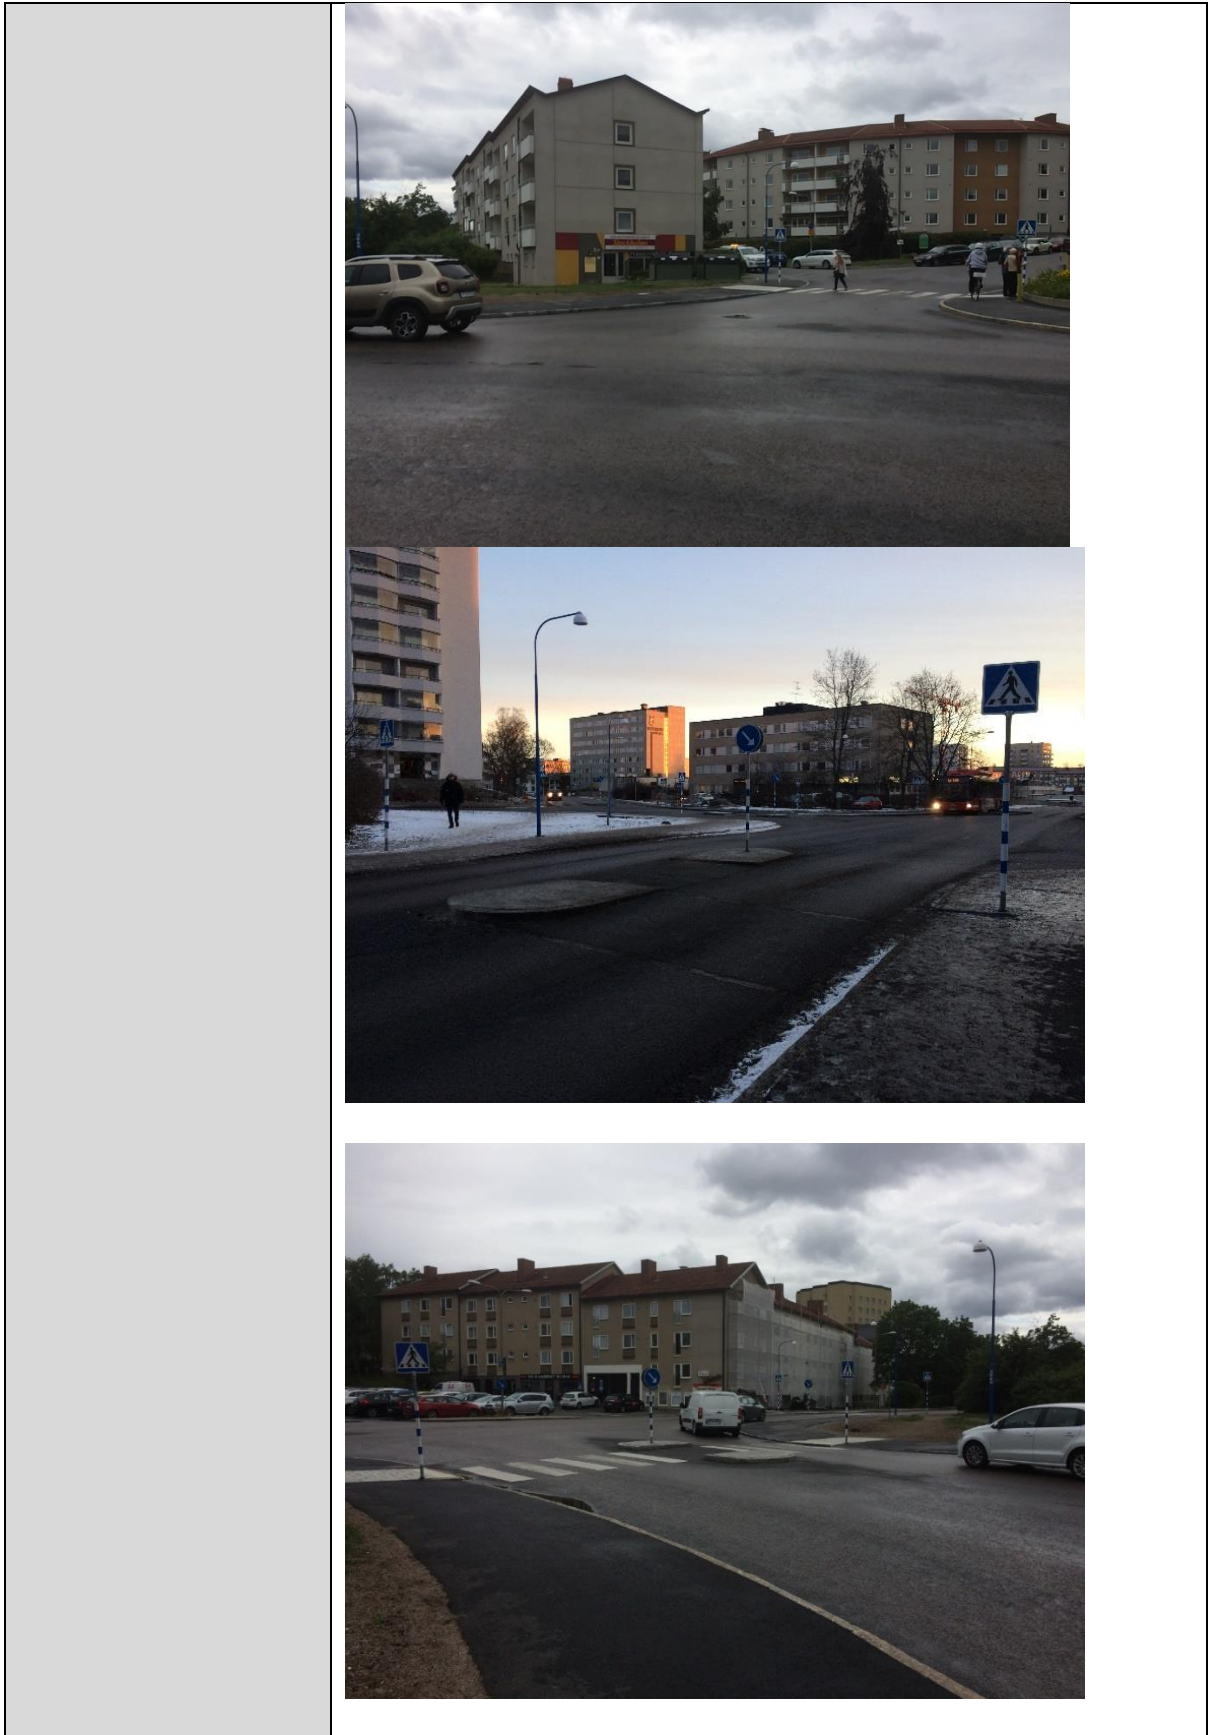

	<b>Vantörsvägen</b> 
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Projektet drog ut på tiden i och med att annan entreprenör bedrev ledningsarbeten inom projektområdet. Projektet skulle genomförts år 2018 men på grund av detta samt bristande samordning med belysnings entreprenör så slutfördes projektet år 2019. Förseningen har även lett till ökade kostnader.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p><b>Totalt Genomförande</b>        Utfall: 4 025 000 kr        Genomförandebeslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Summa utgifter: 4 465 000 kr</li> <li>- Summa inkomster: 1 438 000 kr</li> <li>- Total budget: 3 027 000 kr</li> </ul>

<b>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
