

SLUTREDOVISNING

Fårdalaskola paviljonger



Målet med projektet

- Projektet syfte är att tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola under ca 7 år.
- Möjliggöra plats för tal-och språkklasser på skolan

Projektets resultat

- 4 klassrum men tillhörande grupprum har tillskapats i de tillfälliga paviljongerna. Detta har lett till att årskurs 6 har kunnat flytta tillbaka från Nybodaskola till Fårdalaskola samt att klassrum för tal- och språkklasser har tillskapats.
- Paviljongerna har utrustats med rum för pedagogisk verksamhet, grupprum, personalrum, städutrymmen samt toaletter. Utformningen är planerad tillsammans med Barn-och utbildningsförvaltningen samt representanter från skolans verksamhet.
- Projektet har resulterat i att beställares krav har kunna tillgodoses i enlighet med beställning.



Tidsåtgång

- Bygget utfördes på uppdrag av Förvaltningen för Barn-och utbildning i Tyresö kommun, med Projektavdelningen som byggherre och Algeco som entreprenör.
- Projektet färdigställdes i november 2021, efter en produktionstid på cirka 4 månader.

Beskrivning av resultatet



Beskrivning av resultatet

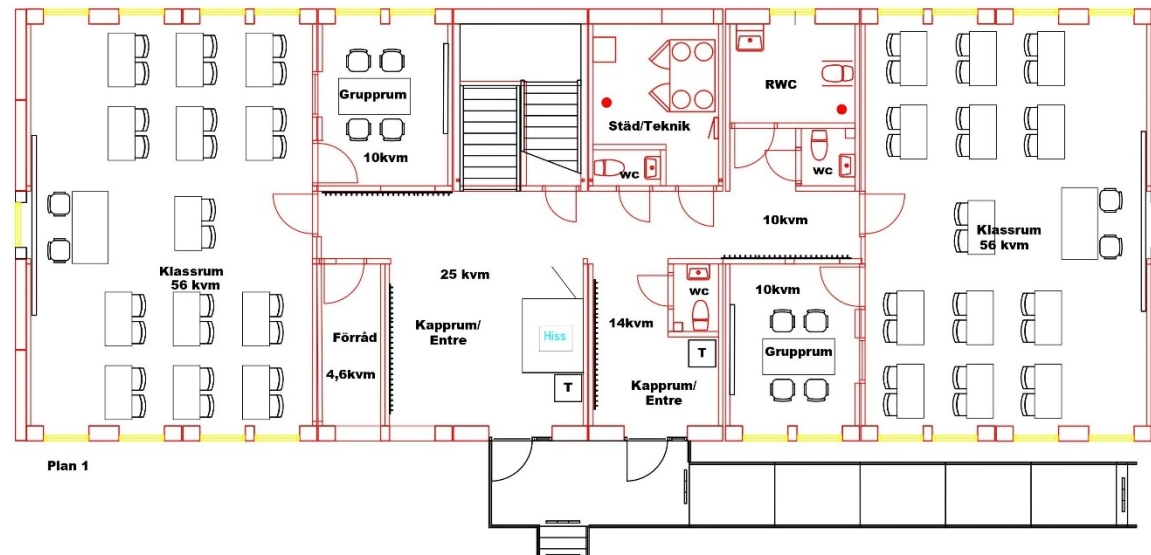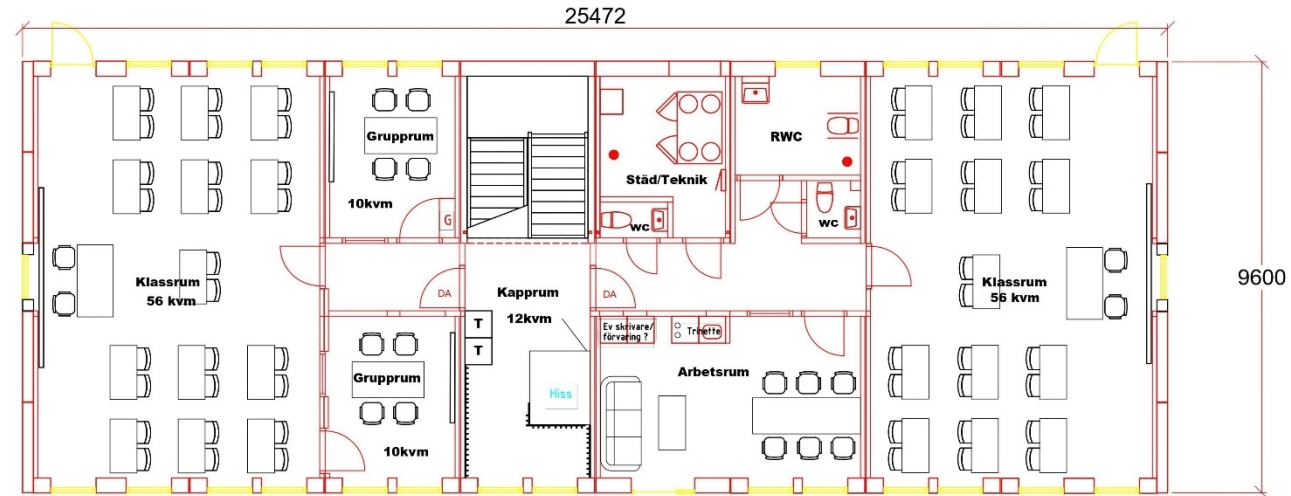

Projektekonomi

- Projektets budget uppgick till 5 100 000 kronor.
- Den totala kostnaden för projektet uppgår till ca: 3 965 000 kronor.
- Kostnader som uppkommer när paviljongerna skall tas bort, demontage ca 600 000 kronor (reglerat i avtalet med leverantören). Återställning mark, el, VA etc. ca 200 000 kronor

