


Projektname	<i>Akalla Busstation (projektnr. 8007354)</i>
Geografisk plats för investering	<i>Akalla, stadsdel Järva.</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Kontoret avser att genomföra trygghetsåtgärder med fokus på förbättrad belysning. Belysningsinvestering kommer ske genom en kombinerad belysning och utsmyckningslösning, vilket förväntas ge en identitet till platsen samt stärka vistelsevärden.</p> <p>Även nedslitna ytor i nära anslutning till platsen kommer att rustas upp, målning och andra åtgärder som ljuster upp ytor (väggar, tak, mark). Detta bedöms förbättra sikten på platsen och ge ökad trygghet.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Trygghetsåtgärder med fokus på förbättrad belysning är genomförd enligt projektets mål.</p> <p>Utsmyckning är genomförd i enlighet med projektets mål. Framförallt har pelare utsmyckats med mosaik och markytor med ljusare plattor samt att vissa ytor målats för att skapa en ljusare plats med bättre sikt på platsen och på så sätt en tryggare miljö.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Innan genomförandet påbörjades justerades bygghandlingen avseende delar av den planerade markbeläggningen och dess omfattning. Befintlig platsättning som är i gott skick på en mindre yta har bevarats vid rulltrappan samt att en planerad markgjutning ersattes med nya plattor istället.</p> <p>Justeringarna i utförandet utfördes för att kostnaderna skulle ligga i nivå med projektets kalkyl samt för att inte behöva påverka entrén till tunnelbanan. Efter utförda justeringar påverkades inte entrén till tunnelbanan av genomförandet och kunde hållas öppen under tiden då entreprenadarbetena utfördes.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p><i>Total budget för projektet är 8,5mnkr, (GB är taget i Trafiknämnden den 15 feb 2024 och beslutat belopp var då 6 mnkr. Ett reviderat GB enligt delegationsordning togs fram 19 maj 2025 på 2,5 mnkr).</i></p> <p>Projektets utfall ligger inom budget. De totala bokförda kostnaderna per sista december 2025 uppgår till 7,24 mnkr. Projektet är ännu inte helt avslutat, vilket innebär att ytterligare kostnader om cirka 550 tkr beräknas tillkomma under 2026.</p>

Bilder före

bilder innan trygghetsinvestering.

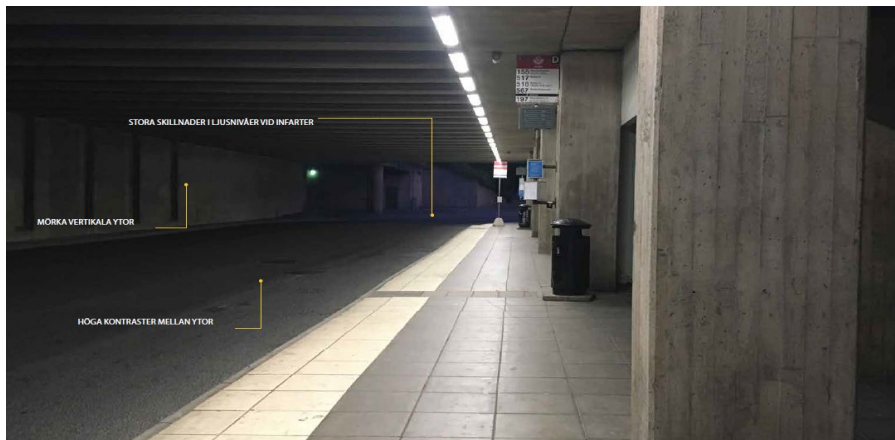

Bilder efter

Bilder efter trygghetsinvestering.



