
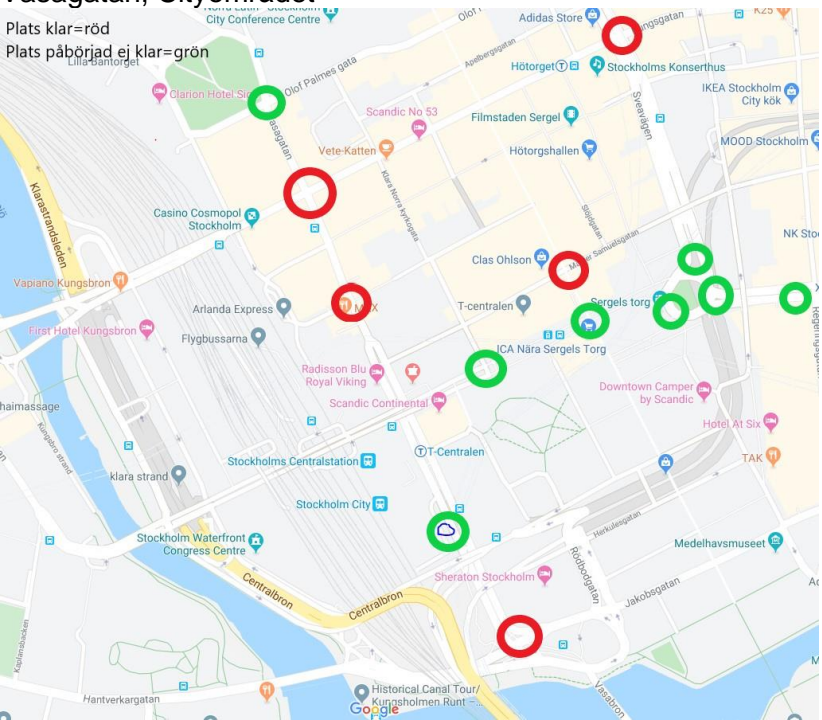
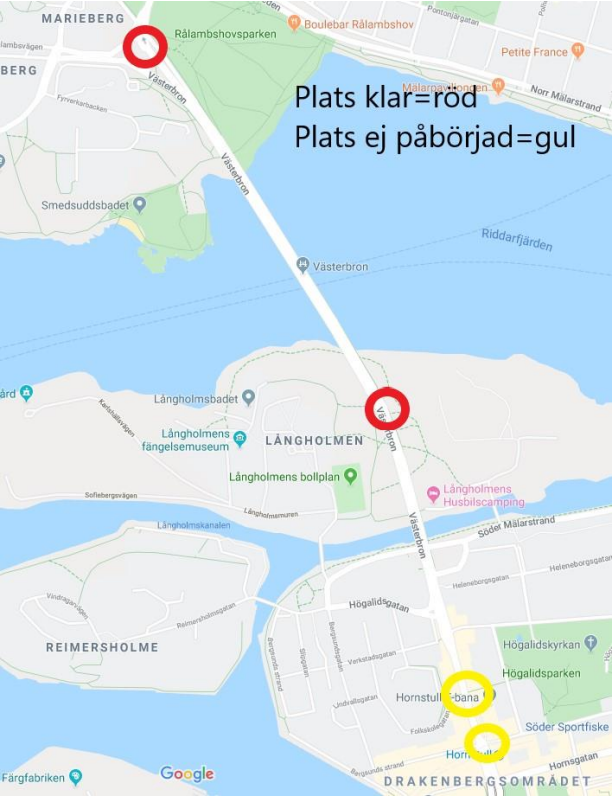


Projektnamn	8004297 Säkerhetskameror
--------------------	--------------------------

<p>Geografisk plats för investering</p>	<p>Vasagatan, cityområdet, Södermalm, Västerbron</p>
	<p>Vasagatan, Cityområdet</p> <p>Plats klar=röd Plats påbörjad ej klar=grön</p>  <p>Södermalm Västra:</p> <p>Plats klar=röd Plats ej påbörjad=gul</p> 

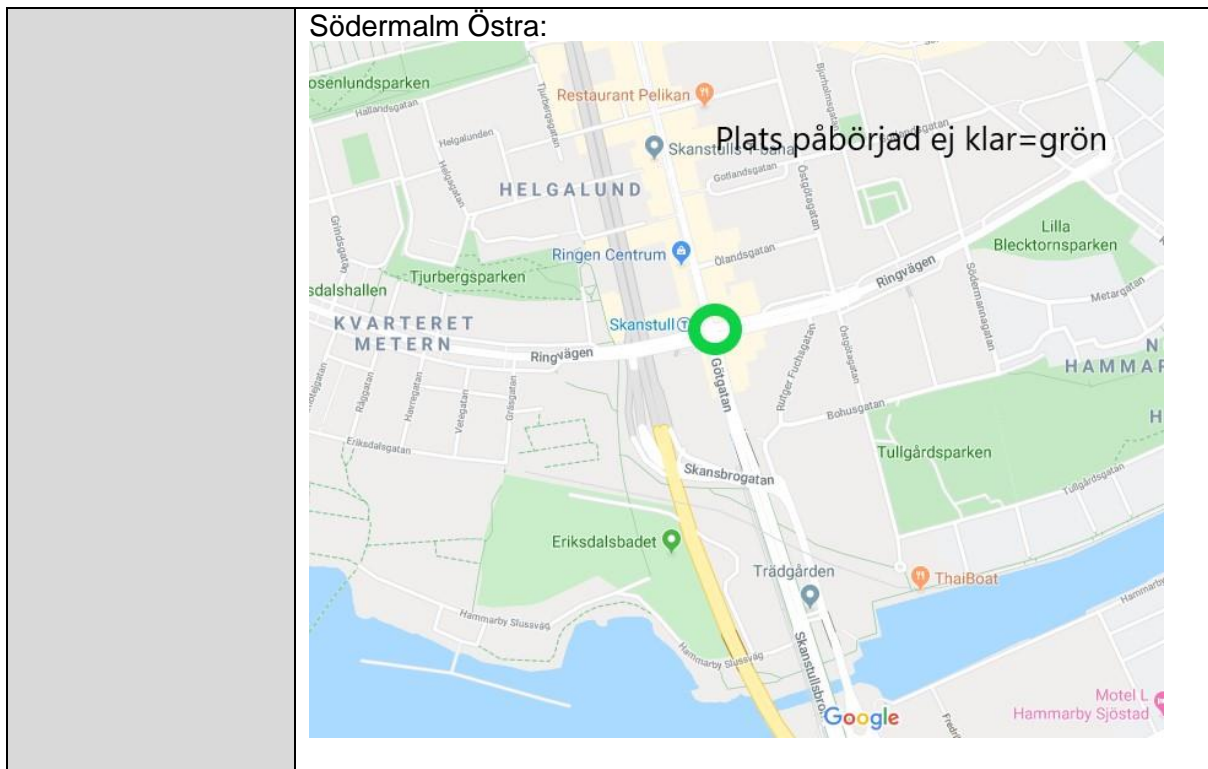

**Projektets mål
och syfte**

Montering av kopplingspunkter till säkerhetskameror för Polisens räkning i trafiksignalsstolpar samt i master med erforderlig kabeldragning och övrig utrustning kopplad till detta.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Detta projekt påbörjades med en test montering av säkerhetskamera i trafiksignalsstolpe vid Kungsträdgården. Detta var till stor nytta för Polisen och de önskade då fler platser runt om i Stockholm där de valde ut de viktigaste platserna i cityområdet. Då hamnade 15 av platserna på ställen där de önskade montagen i trafiksignalstolpar. Samt vi har också förberett för poliskameror där vi har monterat master med trafikövervakningskameror på Västerbron (Långholmen) samt på Västerbroplan.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Vasagatan låg under ett större projekt som jag delgav Polisen att dessa platser kommer trafiksignalmässigt att byggas om de närmsta åren så det var stor risk att dessa inte skulle kunna färdigställas. Samt att kanalisation till våra stolpar är ibland i dåligt skick så stora schaktinsatser krävs samt att förstärkning för stolparna är en relativt dyr åtgärd. De platserna vis Hornstull hans inte med under 2019, samt att plasterna på Klarabergsgatan inte vart helt klara innan vintern.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Kalkylerade utgifter har varit 215 000 kr/plats. Där priset har blivit högre generellt mot budget detta tack vara den dyra schaktkostnaden. Prishöjningen har blivit totalt cirka 85 000:- dyrare/ plats och har därmed slutat på cirka 300 000:-/plats. Platserna på Västerbron har Polisen fått gå med eftersom dessa master skulle byggas för trafik Stockholms räkning.</p>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Typ: Anläggning 4403 Tegelbacken.</i> 
