



Slutredovisning

Upprättad av	Christina Akbar
Godkänd av	Jenny Carlsson
Datum	2023-03-14
Projektnamn	Smärre gatuåtgärder, skolor 2021
Projektnummer	8004767

Adress	
Stadsdel	Projektet omfattar åtgärder inom hela Stockholms stad.
Kartbild	


Syfte och avgränsning	<p>Detta projekt omfattar projektering och genomförande av smärre trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor.</p> <p>Dessa smärre skolåtgärder är ett komplement till trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Inom planen väljs skolor ut via urvalskriterier. Dessa urvalskriterier baseras på trafiksituationen kring skolan, hastighetsmätningar, skolans närhet till en huvudgata och elevantal.</p>
-----------------------	--

Projektets åtgärder	<p>Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2020 är istället kopplade till skolor som inte uppfyller alla urvalskriterier, men som är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärdena rör sig oftast om hastighetssäkring av passager, vägmålning, komplettering av skyltar och vägmärken etc. Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor</p>
---------------------	---

	<p>2020 inkluderar även utredning vid skolor som valts ut via urvalskriterierna.</p> <p>Åtgärder i detta projekt är i regel initierade av områdesansvarig trafikplanerare eller via medborgare.</p> <p>Projektet syftar till att uppfylla de mål som finns definierade inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Projektets berörs huvudsakligen av mål 1: skapa säkra och trygga skolvägar.</p> <p>Projektet pågår under 2020 och inkluderar åtgärder i hela staden. Urval av platser och åtgärder prioriteras utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet, i syfte att skapa säkra och trygga skolvägar.</p>
--	---

Slutredovisning

Inom projektet har smärre åtgärder genomförts vid Persikogatan (Maltesholmsskolan), Björngårdsskolan, Norrbyskolan, Observatorielunden och Sandåkraskolan.

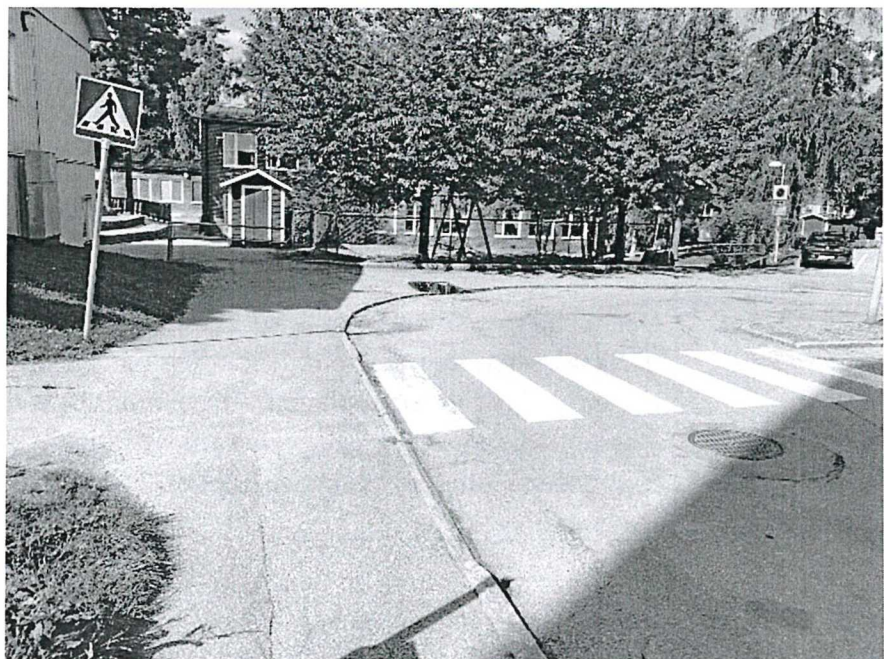Bilder före	 <p>Maltesholmsskolan (Persikogatan)</p>
------------------------	--



Björngårdsskolan (Björngårdsgatan)



Norrbysskolan (Kronofogdevägen)




Observatorielundens skola (Gyldéngata)




Sandåkraskolan (Pepparkaksgränd)

Bilder
efter

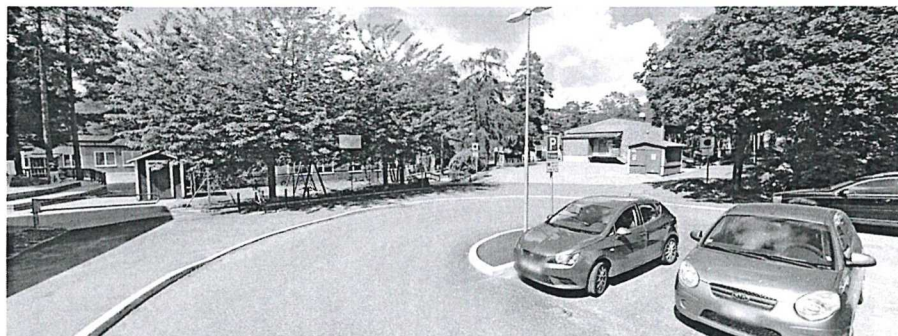


Maltesholmsskolan (Persikogatan)

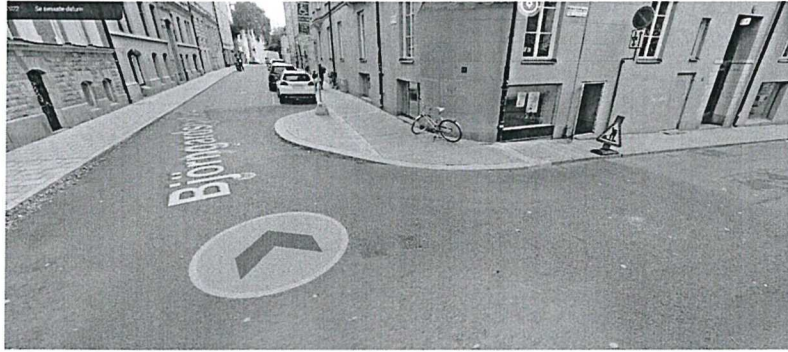

Björngårdsskolan (Björngårdsgatan)



Norrbysskolan (Kronofogdevägen)

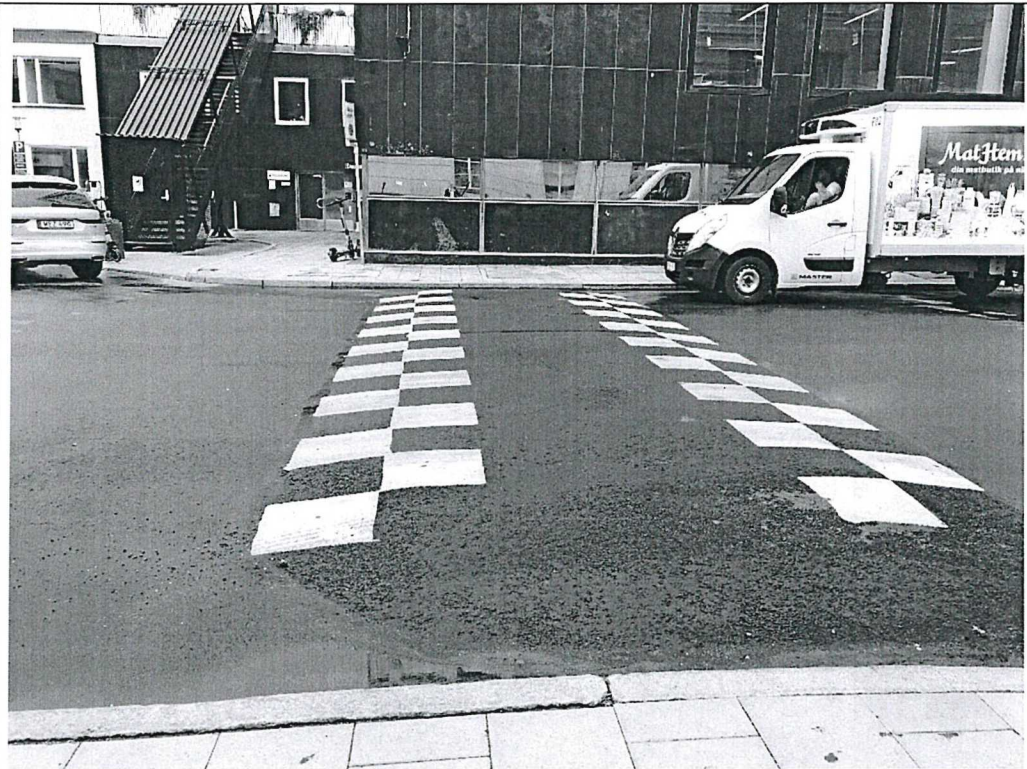

Observatorielundens skola (Gyldéngatan)



Sandåkraskolan (Pepparkaksgränd)

Beskrivning av eventuella avvikelser

Inom projektet har även utredningar genomförts vilket inte ursprungligen ingick i projektet.



i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall	Utfall: 2 193 500 kr Utfallet blev lägre än genomförandebeslutet pga. paus i explo projekt vid Rödabergsskolan som innebar att vi var tvungna att paua vårt projekt.

Slutredovisat (enligt delegationsordning)	
Namn	Datum

