





Projektnamn	<i>Tegelbacken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Tegelbacken, Normalm</i> 
Projektets mål och syfte	Målet med åtgärden är att skydda de nya vistelseplatserna på Tegelbacken och Rödbodtorget från fordonsattacker. Fordonshindren ska utföras som den del av platsens gestaltning.

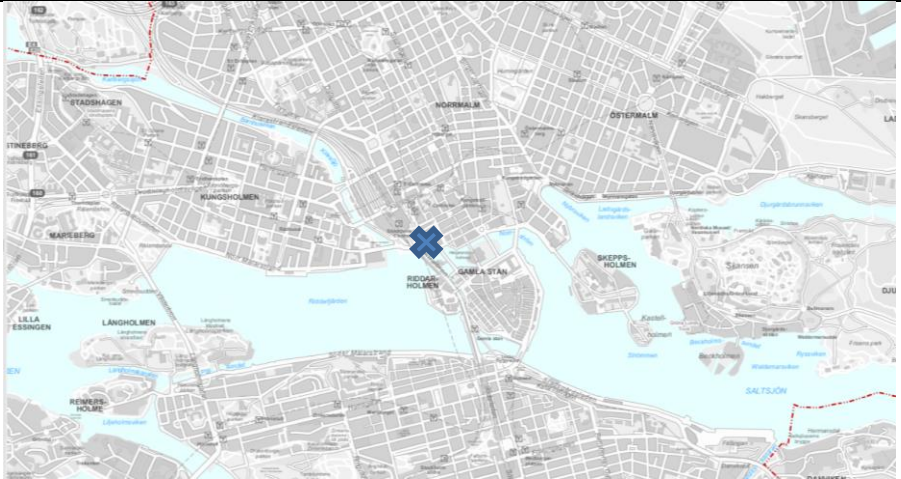

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Fordonshindren har byggts på det sätt som var planerat utifrån åtgärdens mål och syfte.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Enligt ansökan skulle dessa fordonshinder byggas inom projektet under 2025: • 2 granitmurar på Tegelbacken • 4 granitpollare på Tegelbacken • 7 stålpollare på Tegelbacken Under 2026 skulle dessa byggas under 2026 (ingick inte i ansökan utan var planerat för nästa ansökningsomgång): • 2 granitmurar på Rödbodtorget • 3 runda granitmurar på Rödbodtorget • 13 granitpollare på Rödbodtorget. Av anläggningstekniska skäl har inte allt som skulle utföras under 2025 kunnat göras klart. Samtidigt har en stor del av det som var planerat att utföras under 2026, kunnat genomföras under 2025. Detta färdigställdes under 2025: • 2 granitmurar på Tegelbacken • 2 granitpollare på Tegelbacken • 3 runda granitmurar på Rödbodtorget • 11 granitpollare på Rödbodtorget.

Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Kalkylerad utgift var 3,2 mnkr. Utfallet blev 3,3 mnkr.

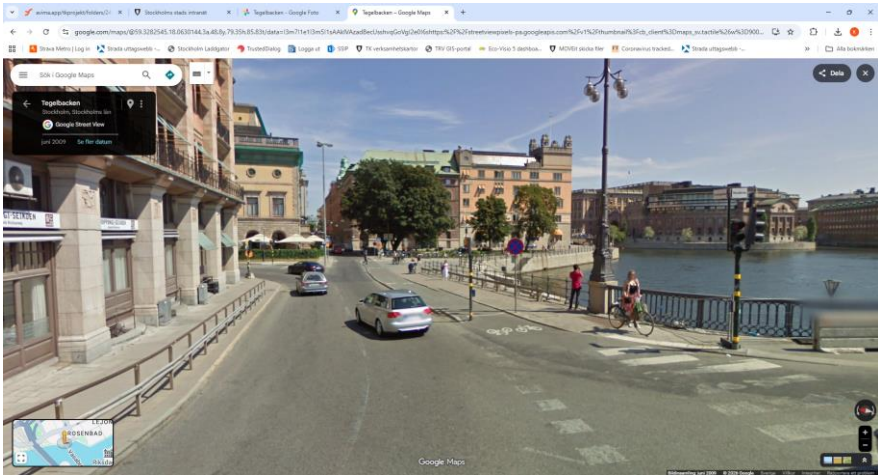Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i> 
---------------------------	---

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

