




Projektnamn	Fordonshinder Östermalmstorg
Geografisk plats för investering	Östermalmstorg 
Projektets mål och syfte	Att anlägga fasta trafikhinder som försvårar olovlig trafik på torget, och skyddar mot terrordåd. Och att dessa åtgärder bidrar till ökad trygghet för folk som vistas i och kring torget.

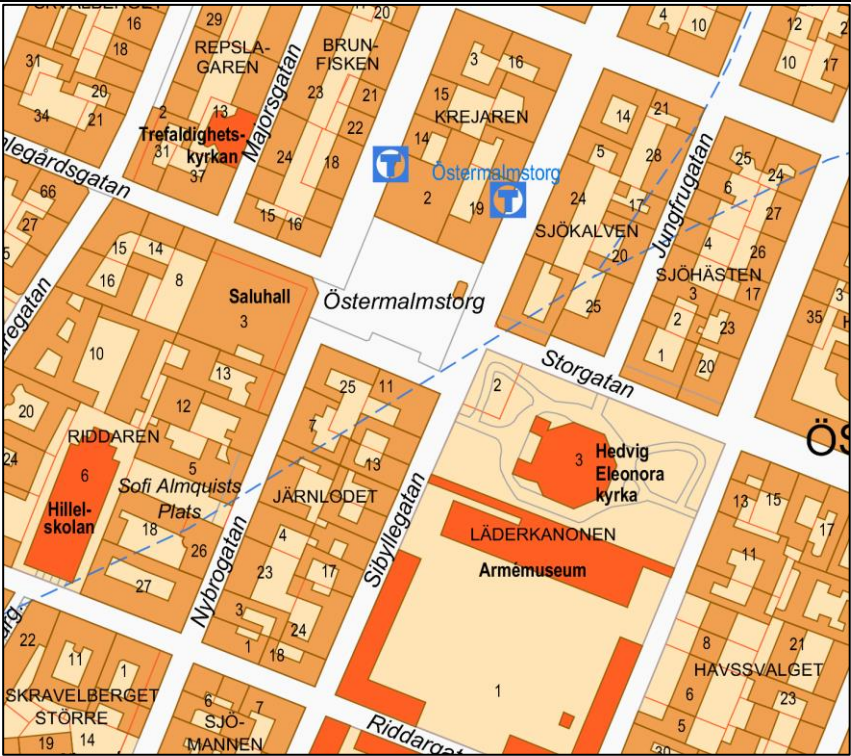

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Staden har under flera år, med bakgrund i bl. a terrordådet 2017, bedrivit arbete med skydd mot fordonsattacker tillsammans med polisen. Östermalmstorg har höga flöden och volymer av oskyddade trafikanter och har nu genom upprustningen blivit en säkrare plats för vistelse, och genom övriga upprustningen utöver trygghetsperspektivet även en attraktivare plats att vara på. Tidigare utplaceringar av tillfälliga hinder har ersatts med permanenta lösningar där även räddningstjänsten varit delaktiga.																																																																											
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Av tekniska skäl har inte de permanenta lösningarna klätts med granit som det stod i ansökan. Denna förändring är enbart estetisk och påverkar inte pollarnas funktion.																																																																											
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<table><tr><th colspan="2">Mål</th><th colspan="2">54 524 720</th><th colspan="2">1 039 359</th><th colspan="2">Lyft 19 25-09-25</th><th colspan="2">Ackumulerat</th></tr><tr><th>Beskrivning</th><th>M</th><th>Mängd</th><th>Enhet</th><th>Summa</th><th>Mängd</th><th>Summa</th><th>Underlag</th><th>Kommentar 1</th><th>Kommentar 2</th><th>Mängd</th><th>Enhet</th><th>Procent</th></tr><tr><td>Smidesrör, 81: Bäcker av stål</td><td>1</td><td>2,1</td><td>3 122</td><td>67 488</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>67 488</td><td>st</td><td>100%</td></tr><tr><td>Pollare, PGI: Pollare och hölje inkl fundament</td><td>10</td><td>71,0</td><td>51 996</td><td>3 763 716</td><td>3</td><td>3 763 716</td><td>3</td><td>3 763 716</td><td></td><td>3 763 716</td><td>st</td><td>100%</td></tr><tr><td>Pollare, PGI: Pollare med spegelfundament och hölje inkl fundament</td><td>10</td><td>2,0</td><td>56 880</td><td>56 880</td><td>1</td><td>56 880</td><td>1</td><td>56 880</td><td></td><td>56 880</td><td>st</td><td>100%</td></tr><tr><td>Pollare, PGI: Pollare för nedjutting och hölje</td><td>10</td><td>2,0</td><td>51 571</td><td>51 571</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>st</td><td>0%</td></tr></table> Bedömd kostnad enligt ansökan: 3 800 000 kr Ackumulerad kostnad, utfall: 3 996 666 kr Avvikelse: -196 666 kr	Mål		54 524 720		1 039 359		Lyft 19 25-09-25		Ackumulerat		Beskrivning	M	Mängd	Enhet	Summa	Mängd	Summa	Underlag	Kommentar 1	Kommentar 2	Mängd	Enhet	Procent	Smidesrör, 81: Bäcker av stål	1	2,1	3 122	67 488	0	0				67 488	st	100%	Pollare, PGI: Pollare och hölje inkl fundament	10	71,0	51 996	3 763 716	3	3 763 716	3	3 763 716		3 763 716	st	100%	Pollare, PGI: Pollare med spegelfundament och hölje inkl fundament	10	2,0	56 880	56 880	1	56 880	1	56 880		56 880	st	100%	Pollare, PGI: Pollare för nedjutting och hölje	10	2,0	51 571	51 571	0	0				0	st	0%
Mål		54 524 720		1 039 359		Lyft 19 25-09-25		Ackumulerat																																																																				
Beskrivning	M	Mängd	Enhet	Summa	Mängd	Summa	Underlag	Kommentar 1	Kommentar 2	Mängd	Enhet	Procent																																																																
Smidesrör, 81: Bäcker av stål	1	2,1	3 122	67 488	0	0				67 488	st	100%																																																																
Pollare, PGI: Pollare och hölje inkl fundament	10	71,0	51 996	3 763 716	3	3 763 716	3	3 763 716		3 763 716	st	100%																																																																
Pollare, PGI: Pollare med spegelfundament och hölje inkl fundament	10	2,0	56 880	56 880	1	56 880	1	56 880		56 880	st	100%																																																																
Pollare, PGI: Pollare för nedjutting och hölje	10	2,0	51 571	51 571	0	0				0	st	0%																																																																

Bilder före

Bilder från plats innan trygghetsinvestering.

**Bilder efter**

Bilder från plats efter trygghetsinvestering.



