




Projektnamn	"galleri Bredäng" (8007758) Plats aktivering trygghet
Geografisk plats för investering	Bredäng Centrum / skärholmen x 2 tunnlar Eventuell kartbild.  The map shows an aerial view of the Bredäng Centrum area. Key features include Bredängsparken at the top, Bredängskyrkan (church) and Hemköp Bredäng (supermarket) in the upper middle, and Bredäng Centrum (shopping center) in the lower middle. Two red circles are drawn on the map: one around a building near Bredängskyrkan and another around a building near Bredäng Centrum. Other labels include Marockansk massage & hammam & Nail, Lo Mero's Bredäng, Bredäng Tandvård, and Förs. Concordiaväg.
Projektets mål och syfte	Genom att ta hand och aktivera x 2 tunnlar i Bredäng centrum: Öka trygghet och delaktighet av lokala aktör för att bilda positiva krafter att vilja vistas i tunneln. Detta har skett genom tillfälliga konstnärliga utsmyckningar och andra aktiveringsåtgärder med lokala aktör.

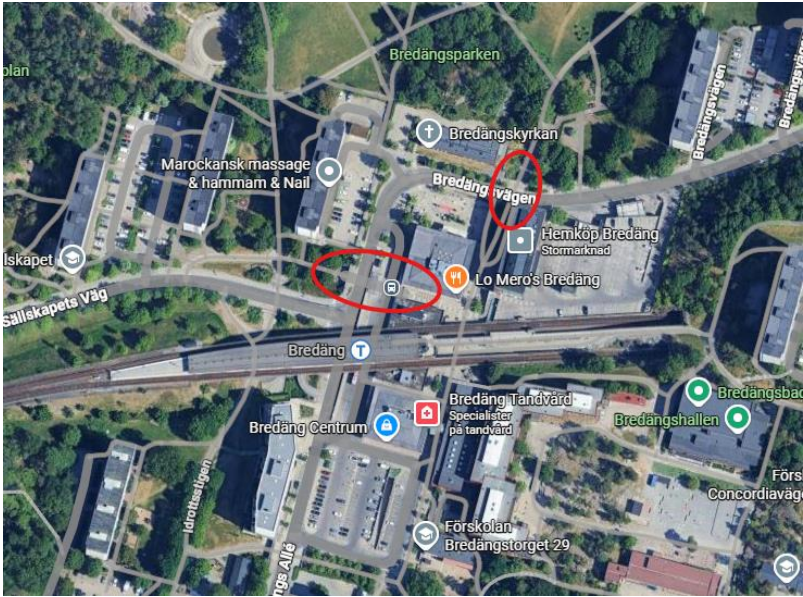

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<u>Tunnel 1 (så kallad "galleri Tunnel"):</u> - flera "konstellningar" är nu installerade i flera delar för varje "underbro" yta som kan användas av tex. Kulturskolan och lokala aktör - o Teknik. Stål konstruktion (skåp x2 modell) med öppningsbara dörrar - o Konstställning står i mitten av bro (i två huvuddelar) - o Egna belysning via LED i skåpet. - Skulptur vid Västra sida i entré av bro (tagits fram av lokal Barn/Skolor och konstnär) - Betong (små) åtgärder reparationer: - o Sockel under konstställning - o Reparation av "trappnäsa" vid översta delen av stora trappa - o Sockel under Skulpturen på västra sida/utgången - o Sockel under "ljudskulpturen" på mitten - Varje vägg i tunnel har befriats av tillkommande objekt - Varje vägg i tunnel har blästrats, repareras (spackla) och skyddas om (klotterskydd) för att restaurera de original betong mönstret - På varje sida av tunnelentré x 2 "skyltar" (tryckt aluminium) har tillverkats och installeras <u>Tunnel 2 (norr sida av centrum):</u> - Varje vägg i tunnel har befriats av tillkommande objekt - Varje vägg i tunnel har blästrats, repareras (spackla) och skyddas om (klotterskydd) för att restaurera de original betong mönstret - På östra Vägg av tunnel, "unga berättar" har bjudits för att tillverka utsmyckningar med lokal unga - o Teknik: aluminium tryckta plåtar
--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Det visade sig svårt att använda sandblästring på plats (med hänsyn till mycket passage i tunnel), istället blev original betongen vatten tvättat.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Betong reparation och återställning blev dyrare än planerad, men projektering och detaljritningar av skåpmontrar blev lite billigare än förkalkylerad. Beviljade trygghetsmedel: 2,7 mnkr Utfall: 2,3 mnkr

Bilder förr:



Dåligt skick av Betong och fel användning av väggar led till slitage




Olika Trasiga Plexiglas kupoler



Allmänt skick förr

Bilder Efter: Huvudtunnel med alla montrar som använd av Kulturskolan bla.



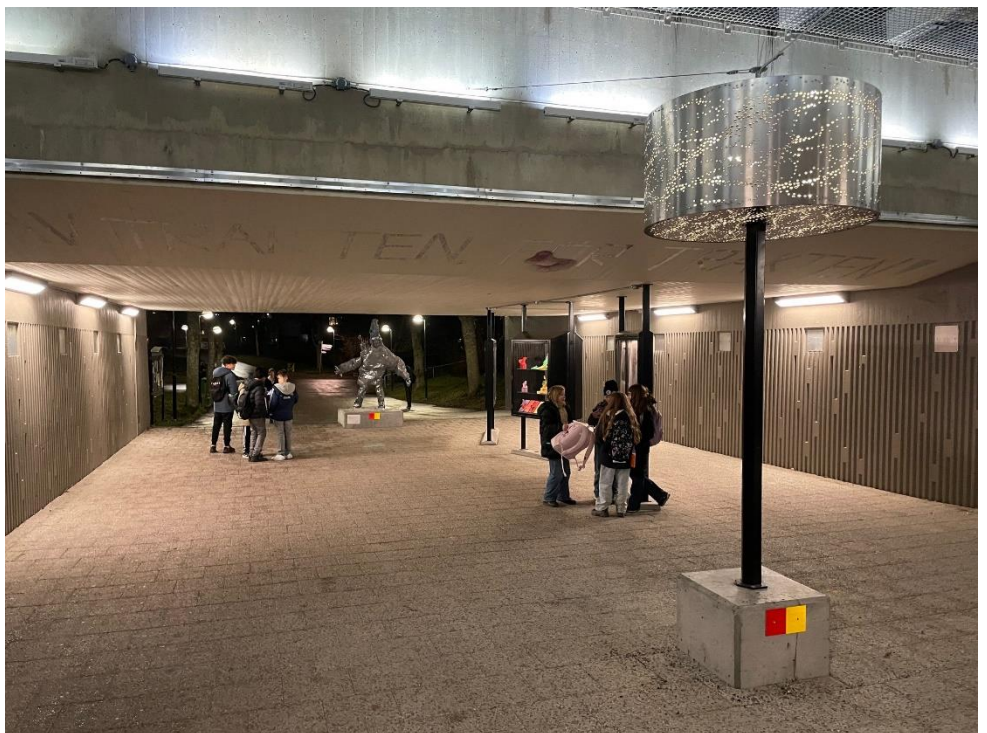

Huvudtunnel med alla montrar som använd av Kulturskolan bla. och "Ljudpelare" i mitten som styrs via Bluetooth.

Mindre Tunnel: Konst har tagits framme med "Unga berättar" och lokala unga.

