Bilaga 8

ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut
0	**Bollmora 2:1, Tyresö**	**874 dagar?**	**21-04-30**	**25-02-11**
1	**1 Antagande av detaljplan**	**89 dagar**	**21-09-01**	**22-01-07**
2	1.1 Slutversion Kvalitetsprogramet	0 dagar	21-09-24	21-09-24
3	1.2 Färdigställande detalplanehandlingar	22 dagar	21-09-01	21-09-30
4	1.3 Interngransning Tyresö Kommun DP-handlingar och avtal	10 dagar	21-10-04	21-10-15
5	1.4 Justeringa Dp och avtal inför antagande	4 dagar	21-10-18	21-10-21
6	1.5 Anmälan Dp och avtal för antagande	0 dagar	21-10-22	21-10-22
7	1.6 Inlämning till SU	0 dagar	21-11-05	21-11-05
8	1.7 Stadsbyggnadsutskottet, Samanträde	0 dagar	21-11-17	21-11-17
9	1.8 Inlämning till Kommun Styrelsen	0 dagar	21-11-29	21-11-29
10	1.9 Kommun Styrelsen, Samanträde	0 dagar	21-12-07	21-12-07
11	1.10 Kommun Fullmäktige	0 dagar	21-12-16	21-12-16
12	1.11 Överklagandetid	3 tveckor	21-12-17	22-01-07
13	1.12 Laga kraft vunnen Dp	0 dagar	22-01-07	22-01-07
14	**2 Fastighetsreglering**	**150 dagar**	**22-01-07**	**22-09-09**
15	2.1 Inlämning fastighetsregleringen till Lantmäteriet	0 dagar	22-01-07	22-01-07
16	2.2 Handlägningstid	30 veckor	22-01-10	22-09-09
17	2.3 Beslut förättning	0 dagar	22-09-09	22-09-09
18	**3 Markförvärv**	**280 dagar?**	**21-04-30**	**22-07-25**
19	3.1 Upprättande av avtal	88 dagar	21-04-30	21-09-30
20	3.2 Singering avtal	0 dagar?	21-11-03	21-11-03
21	3.3 Erläggande av handpenning	0 dagar	21-11-03	21-11-03
22	3.4 Tillträde av fastigheten?	0 dagar?	22-07-25	22-07-25
23	**4 Fjärrvärmeflytt**	**209 dagar?**	**21-08-31**	**22-06-30**
24	4.1 Fjärrvärmeflytten Beställd	0 dagar	21-08-31	21-08-31
25	4.2 Flytt av fjärrvärmen	44 dagar?	22-04-27	22-06-30
26	**5 Fas- Bygglovshantering, Systemhandlinga**	**215 dagar**	**22-01-04**	**22-12-06**
27	5.1 Bygglovsprojektering	12,6 veckor	22-01-04	22-04-01
28	5.2 Granskning gentemot kvalitetsprogrammet	4,4 veckor	22-04-04	22-05-05
29	5.3 Ansökan bygglov	10 veckor	22-05-06	22-08-16
30	5.4 Beslut bygglov	0 dagar	22-08-16	22-08-16
31	5.5 Projektering systemhandlingar	16 veckor	22-08-17	22-12-06
32	**6 Fas- Genomförande**	**502 dagar**	**22-12-14**	**25-02-11**
33	6.1 Förfrågan/Upphandling UE	12 veckor	22-12-14	23-03-09
34	6.2 Markararbeten. Sprängning/schaktning	15 veckor	23-03-10	23-06-30
35	6.3 Uppbyggnad källarvåning	12,4 veckor	23-07-03	23-10-24
36	6.4 Stomme montage	20 veckor	23-10-25	24-03-15
37	6.5 Stomkompletteringar	35 veckor	24-02-05	24-11-11
38	6.6 Besiktningar/slutmöte	8 veckor	24-11-12	25-01-14
39	6.7 Inflyttningar	4 veckor	25-01-15	25-02-11

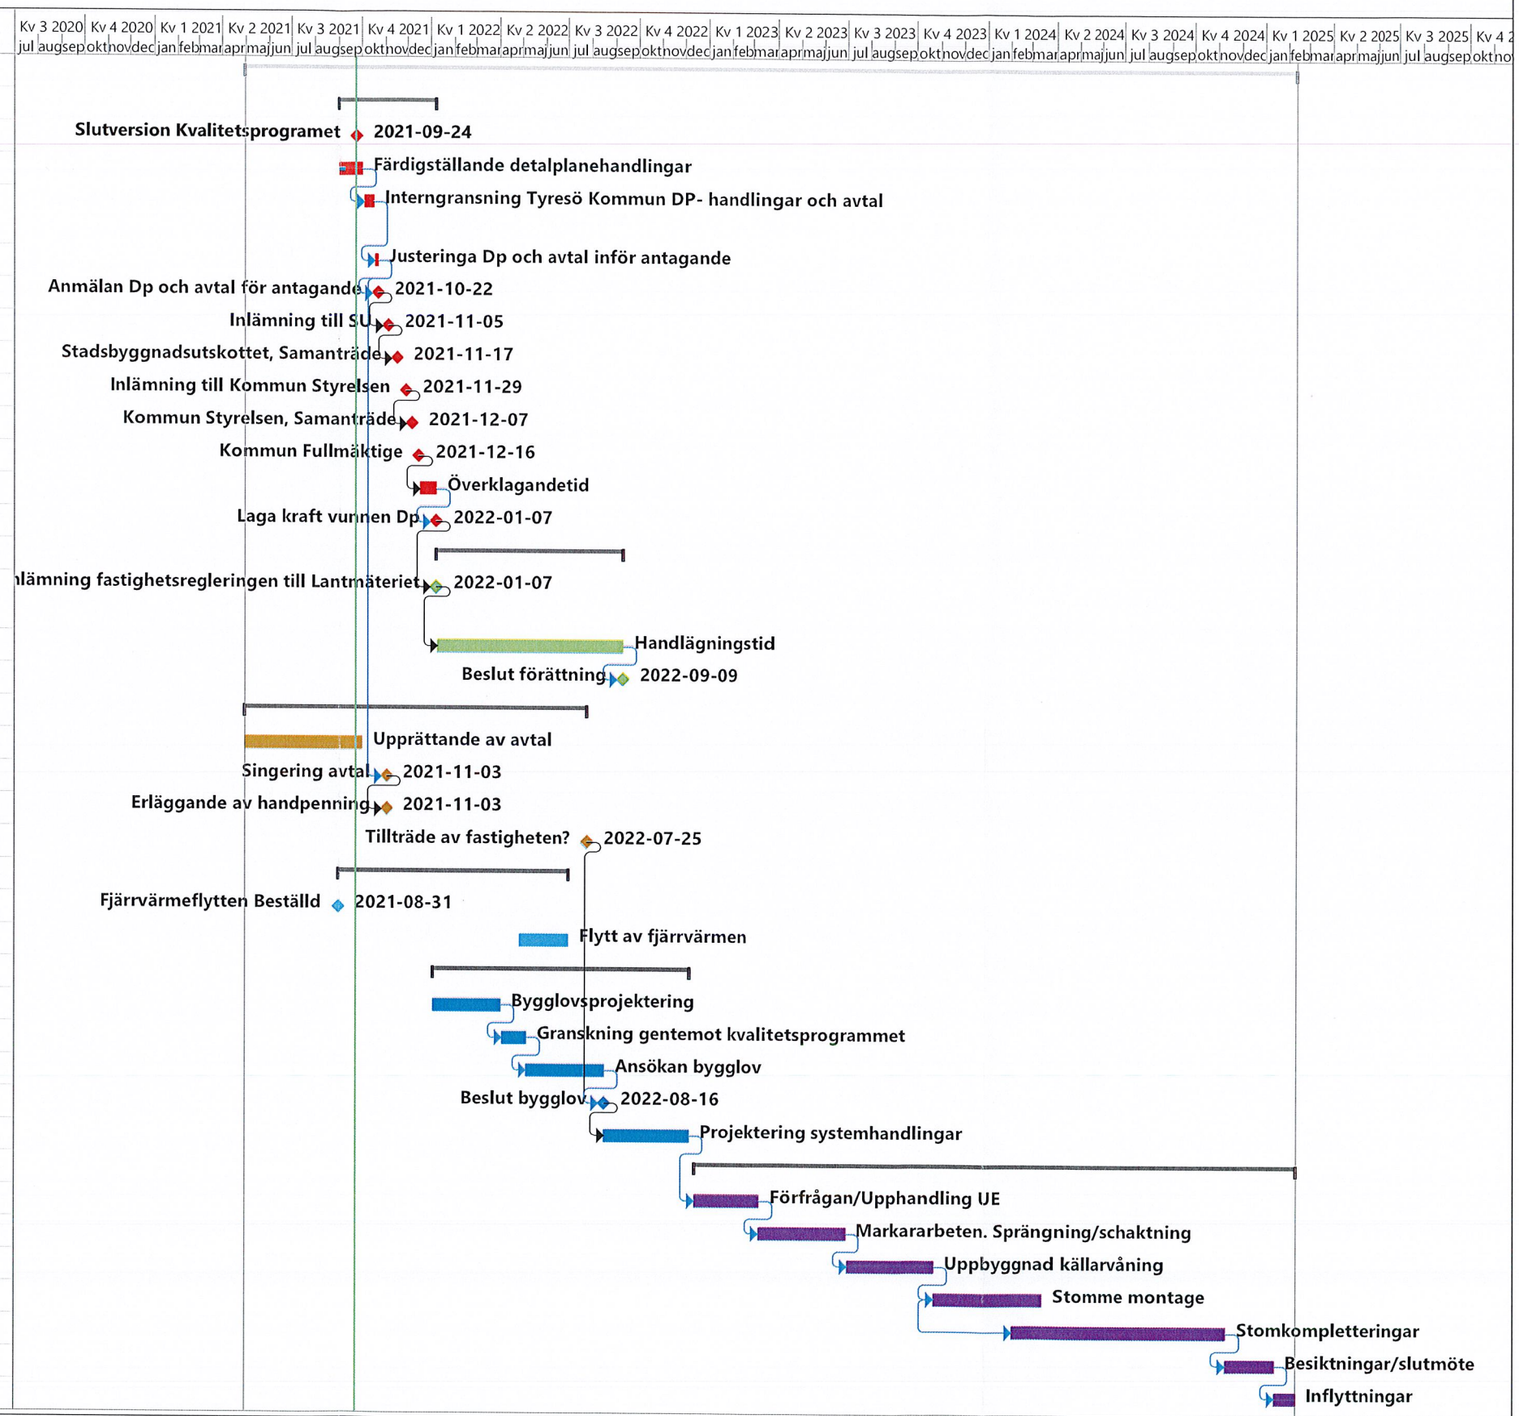

BRICK HOUSE

Bollmora 2:1, Tyresö

Rev. datum: 21-09-22
Utfärdad av: Johan Blomster
