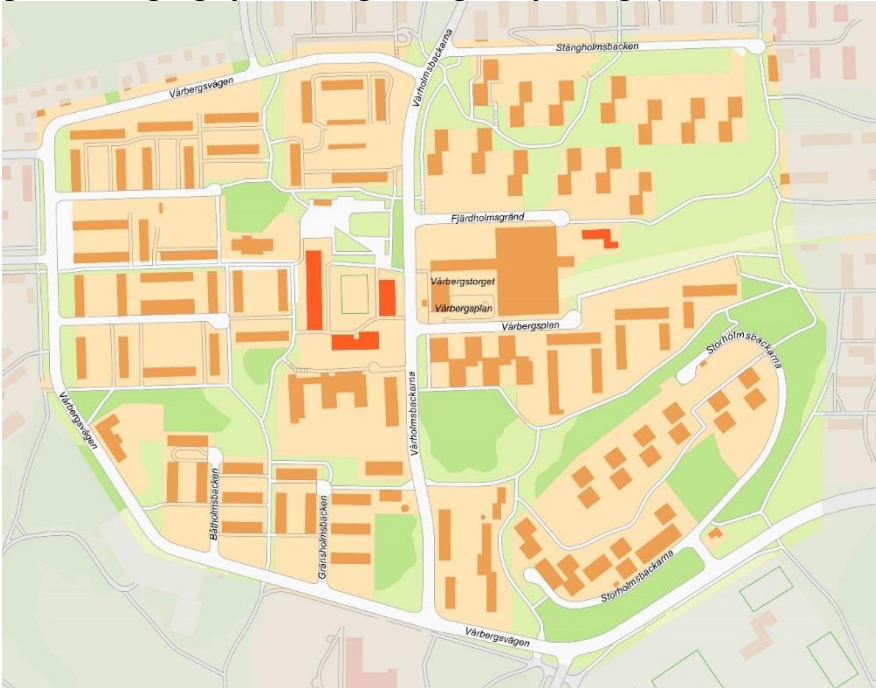


Projektnamn	Medborgarbudget kring trygghet i stadsdelsnämndsområdet
Geografisk plats för investering	Vårberg, Skärholmen stadsdelsnämndområde
	Avgränsningen till projektet gjordes utifrån stadsdelsnämndens ansvarsområde och tog hänsyn till de stadsutvecklingsprojekt som pågår runtom i Vårberg. Vårbergsvägen var skiljelinjen, åtgärderna skulle genomföras på parkmark enligt kartan nedan (yta markerad i grönt samt gång/cykelstråk genom gröna ytor ingår):  Figur 1 Geografisk avgränsning av medborgarbudgetprocessen i Vårberg
Projektets mål och syfte	Syfte: Genom en medborgarbudgetprocess bidra till en ökad trygghet bland invånarna i Vårberg. Långsiktiga mål med medborgarbudgetprocessen och investeringarna, 2-5 år: • Ökad upplevd trygghet • Ökad kollektiv förmåga • Ökad delaktighet Kortsiktiga mål med medborgarbudgetprocessen, 0-1 år • 85% av de kvinnor och män som deltar i idégenereringen tycker det var meningsfullt att delta • 85% av de kvinnor och män som deltar i idégenereringen har träffat nya personer


	• 85% av de kvinnor och män som deltar i idégenereringen kan tänka sig att delta i en liknande process igen • Minst 50 kvinnor och 50 män deltar i idégenereringen • 5% av röstberättigade kvinnor och män som bor i Vårberg deltar i omröstningen (drygt 400 personer)
--	---

Slutredovisning


Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Förvaltningen genomförde en medborgarbudgetprocess för att identifiera vilka områden i Vårbergs som invånare upplevde som otrygga. Under våren 2018 utfördes det sex stycken workshops för medborgarbudgetens idégenerering. Invånare bjöds in för att tillsammans ta fram förslag för investeringar i utomhusmiljön. Sammanlagt tolv förslag togs fram och gick från idégenerering till bearbetning. Förslagen bearbetades av en projektgrupp som i sin tur bearbetade ett antal förslag som mötte upp de uppsatta kriterierna för möjliga investeringar. Gruppen tog även hänsyn till planerade stadsbyggnadsprojekt som ska ske runtom i Vårberg. Det genomfördes sedan en omröstning av de förslag som bearbetats av projektgruppen. Invånare i Vårberg fick rösta mellan fem förslag och vinnande förslag blev: • Vårgården som mötesplats Gör Vårgården till en generationsöverskridande mötesplats där det finns pingisbord, klätterställning, studsmattor, hinderbana och mer färg samt belysning. (Dock ej byggnad) Uppskattad kostnad: 2 miljoner kronor Måluppfyllelse med medborgarbudgetprocessen • 86% av deltagarna svarade det var meningsfullt att delta i workshoppen. • 68% av deltagarna svarade att de träffade nya personer i workshoppen. • 82% av deltagarna svarade att de kan tänka sig delta i något liknande igen. • 57 personer deltog i idégenereringen varav 75% var kvinnor och 25% var män. • 216 personer deltog i omröstning. Av dessa var 125 stycken kvinnor varav 84 stycken angav att de bor i Vårberg. Av de 91 män som röstade, angav 52 att de bor i Vårberg. Det innebär att totalt 136 personer var från Vårberg och att målet om 5% inte uppnåddes.
---	--

Parkleken Vårgårdens behov av trygghetsskapande åtgärd

Vårgårdens parklek (se röd punkt i nedanstående karta) angränsar till Vårberg centrum och Alla nationers Friaskola båda platser som utpekats som otrygga i området. Som kvarterspark står Vårgården för den bostadsnära grönytan för möten, lek och samvaro i kvarteret. Vårgårdens parklek är Vårbergs största park och är en central mötesplats i området.

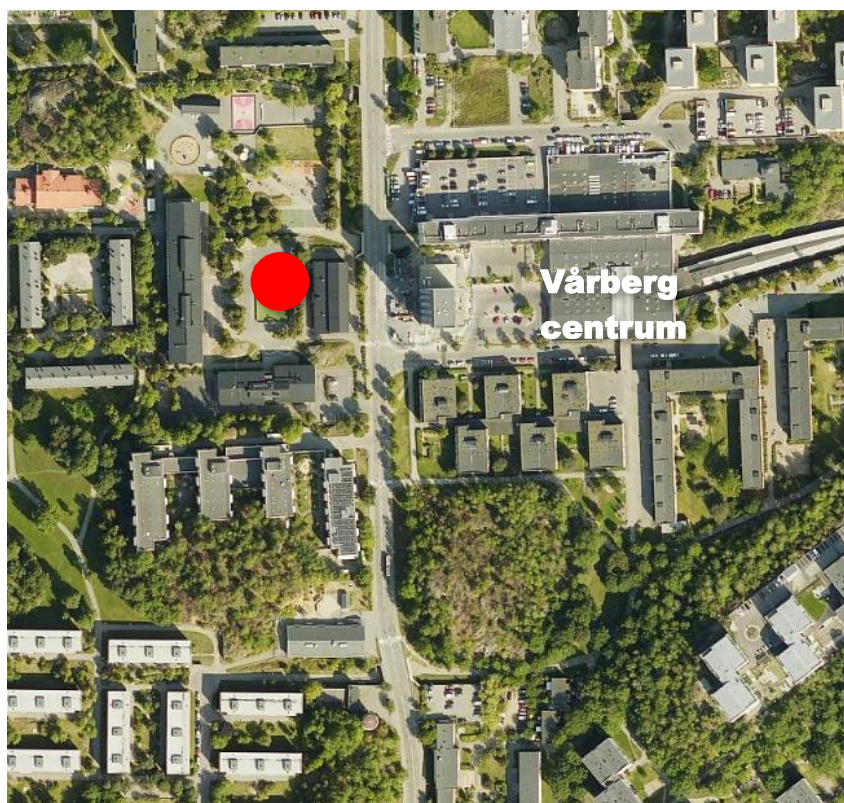

Vårgården består till stora delar av ytor avsedda för lek och sport. Vårgårdens fritidsgård huserar i ett enplanshus i parkens nordvästra del. Lekredskap för äldre och yngre barn är blandade och utspridda i parken, vilket medför att barnen springer mellan de olika delarna. I Vårgårdens västra del finns en inhägnad småbarnslek som upplevs exponerad och solutsatt där den ligger i mitten av en asfaltsyta. Genom parken löper ett viktigt diagonalt gångstråk. Eftersom inga hinder finns vid parkens entréer trafikeras gångstråket ofta av moped, trots att detta inte är tillåtet. Småbarnslekutrustning utan inhägnad finns på båda sidor om gångstråket vilket skapar påkörningsrisk när barnen rör sig mellan lekredskapen. Vissa delar av parken där vegetationen är tät upplevs som otrygga och mörka. Gångvägar som leder till parken genom tunnlar och portiker samt otydliga entréer bidrar även till en känsla av otrygghet på platsen. I parken finns några högre belysningsmaster med armaturer som belyser mitten av parken. Omkringliggande platser och vägar har

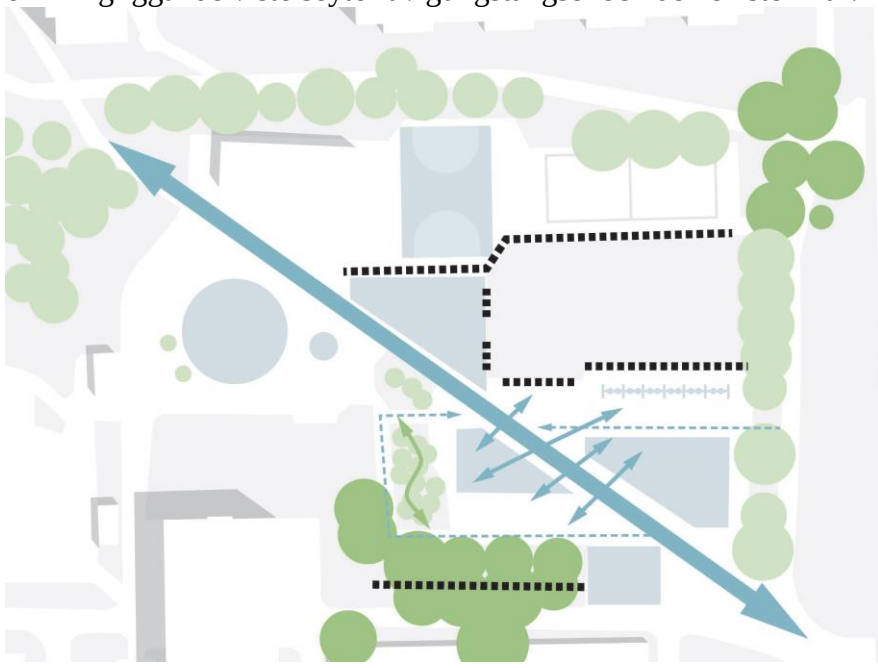	dock en äldre parkvägsbelysning som i kombination med uppvuxen vegetation bidrar till något mörka anslutningar till parken. En samlingsplats med bänkbord, grill och väderskydd ligger centralt i parken. Temporära odlingslådor är också placerade här. Platsen är dock liten och det finns inte tillräckligt med sittplatser för större samlingar och kallas. Gräsytan är något sliten och svåråtkomlig då den är avskuren från omkringliggande vistelsezoner av gungstängsel och den en stenmur. 
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Avvikelse: Medborgarbudgetprocessen visade sig kräva mer tid för planering och förberedelser samt för förankring med olika forum både inom förvaltningen och med externa aktörer. Detta har inneburit en uppskjutning av efterföljande faser som framtagande av programhandlingar och projektering som skede under hösten 2018 och genomförandet av förslaget som planeras under 2019. Av den anledningen ansöker förvaltningen ombudgetering av 1.9 mnkr till 2019.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Total budget: 2 miljoner kronor Investeringsmedel Medborgarbudgetprocessen kostade 152 267 kronor Programhandling 98 000 kronor Ansökan för ombudgetering: Förvaltningen ansöker för ombudgetering av 1.9 mnkr till 2019.

Bilder före

*Infoga **om** bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*



Vårgården, vy mot nordväst, sommaren 2018



Värgården, entrézon, sommaren 2018



Gräsmattan och lekutrustning i bakgrunden, sommaren 2018

Bilder efter

Projektet är inte genomförd än. Därför bifogas bilder av programhandlingarna för projektet.



Illustrationsplan



Sektion A-A'



Sektion B-B'

