

Trygg i Trekantsparken

Projektplan



Magnus Hansson, Tfn 08 508 22 025, e-post: magnus.hansson@stockholm.se
Projektledare: Trygg i Trekantsparken
Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning
Stockholms stad

Innehåll

1. Inledning	3
2. Projektets bakgrund samt projektidén.....	3
3. Mål & syfte	4
4. Metod	6
5. Åtgärdsplan.....	11
6. Avgränsningar & ekonomiska ramar.....	12
7. Projektorganisation	12
8. Kvalitetssäkring	14
9. Risker	15
10. Tidsplan	15

Figurförteckning

Figur 1: Projektmål	4
Figur 2: Delmål	5
Figur 3: Effektmål	6
Figur 4: Projektets metoder	7
Figur 5: Arbetsmetoder vid inventering.....	8
Figur 6: Dialog	10
Figur 7: Samråd med sakkunniga.....	11
Figur 8: Projektorganisation.....	14

I. INLEDNING

Trekanten är en parksjö i området Gröndal-Liljeholmen i sydvästra Stockholm. Området kring sjön Trekanten samt Trekantsparken i Liljeholmen är ett grönt och vackert naturområde. Runt sjön finns möjligheter till bad och fiske.

Rekreationsmöjligheterna är goda. I Trekantsparken vid sjöns östra sida finns bland annat en lekpark kallat fruktparken samt en doftpark. Runt sjön finns bostäder, företag, föreningar, skolor, restauranger, lekplatser, ett servicehus samt en fiskeklubb. Strax intill Trekantsparken ligger Liljeholmstorget där det sedan hösten 2009 finns en galleria. Liljeholmens tunnelbana samt Liljeholmens tvärbanehallplats ligger i anslutningen till Trekantsparken. Närmsta bostadsområdena till sjön Trekanten är Nybohov, Gröndal och Liljeholmens centrum.

Exempel på personer som använder parken och området kring Trekanten är joggar, hundägare och barnfamiljer. Stökiga missbrukare använder även parken. Området kring Trekantssjön har på senare år börjat upplevas som otryggare för många boende i närheten av sjön. En förhållandevis hög otrygghet ger vid handen att det snarare är fråga om en upplevelse än en faktisk risk.

Avsikten med projektet är att kvinnor såväl som män vilka vistas i eller passerar genom parken ska känna sig tryggare och uppleva att om obehagliga situationer hotar så finns hjälp att få. På så vis ämnar detta projekt att forma ett rekreatiomsområde runt sjön Trekanten där alla användare upplever området som tryggt och gärna tillbringar sin fritid.

Boverket har anslagit 420 000 kr i projektmedel. Boverket är även beställare av projektet. Boverket har i sin tur betalat Länsstyrelsen att administrera projektet. Magnus Hansson är projektledare för *Trygg i Trekantsparken*. Projektets styrgrupp är det *Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)* i Hägersten-Liljeholmens (H-L) stadsdelsförvaltning. Projektets referensgrupp är *Gruppen för Tryggare Centrum* i H-L stadsdelsförvaltning. Projektiden för "Trygg i Trekantsparken" är anslagen från 1:a april till 31:a oktober, 2010.

2. PROJEKTETS BAKGRUND SAMT PROJEKTIDÉN

Enligt "Stockholms stads trygghetsmätning 2008" uppger 60-70 % av kvinnorna boendes i områdena runt sjön Trekanten att de känner oro för att vistas i området under dygnets mörka timmar. Många utav invånarna i Nybohov och Gröndal uppger att de känner oro att gå till och från Liljeholmens tunnelbana. Flera av invånarna i Gröndal har hört av sig till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning angående den upplevda otryggheten i området. Otryggheten gäller framförallt för kvinnor. Enligt brottsstatistiken i Stockholm skiljer sig detta område inte nämnvärt från andra områden. Problemet med området är alltså

upplevd otrygghet än faktiskt riskområde. En trolig förklaring till den höga upplevda otryggheten är det höga antalet stökiga missbrukare som vistas i området.


Idén med följande projekt är göra en genomgripande analys av vad det är som skapar otrygghet, alltså vilka otrygghetsskapande komponenter det finns i området. Utefter den analysen är tanken att skapa en miljö runt sjön Trekanten där alla, kvinnor såväl som män, känner sig trygga och gärna vill tillbringa sin fritid.

3. MÅL & SYFTE

Syftet med följande projekt är att öka den upplevda tryggheten i parken och att kvinnor som vistas i eller passerar igenom området runt sjön Trekanten ska uppleva en högre grad av trygghet i området.

För att uppnå projektets syfte har projektet följande två projektmål:


- Generellt att öka den upplevda tryggheten i parkområdet för såväl kvinnor som män. Kvinnor som vistas i eller passerar genom området kring sjön Trekanten samt i Trekantsparken ska uppleva att de känner sig tryggare.
- Förebygga att obehagliga situationer kan uppstå i Trekantsparken. Det vill säga att på olika sätt öka närvaron av människor under alla tidpunkter på dygnet kring sjön Trekanten.



Figur 1: Projektmål

För att uppnå projektmålen har projektgruppen satt upp följande delmål:


- Att ta fram en åtgärdsplan baserad på projektmålen.
- Att genomföra en eller ett antal åtgärder från åtgärdsplanen.

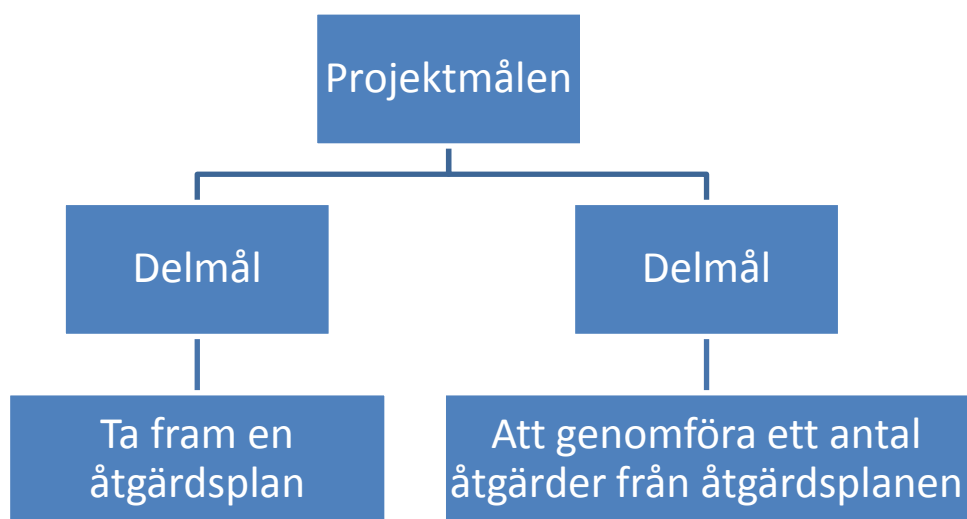

Figur 2: Delmål

Effektmål - Projektets mål på längre sikt:

- Att forma området runt sjön Trekanten till en park där alla känner sig trygga och gärna vill tillbringa sin fritid.
- Att projektet ska ge ringar på vattnet effekter, vilket innebär att projektet ger inspiration till kommande projekt som ämnar öka tryggheten i parkområden.

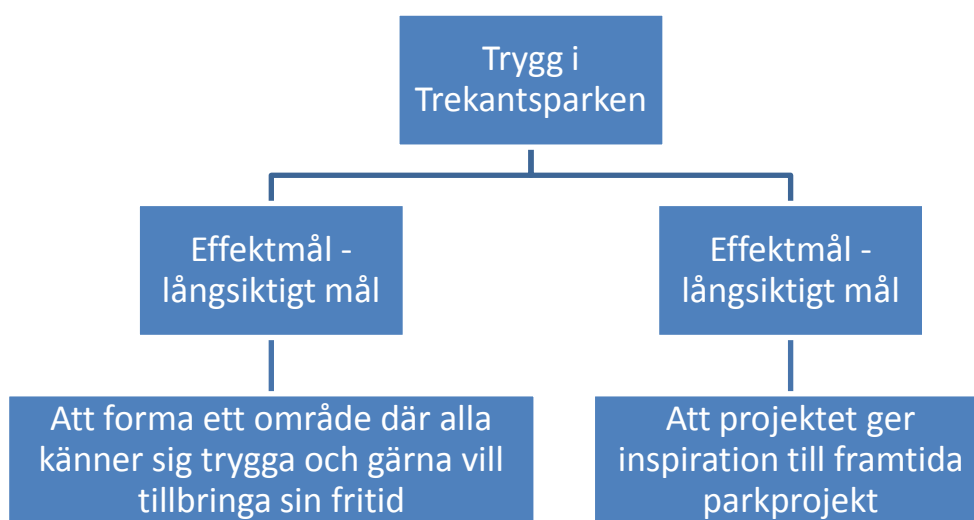

Figur 3: Effektmål


4. METOD

För att uppnå de två delmålen under projekttiden kommer olika metoder att användas.

Projektgruppen till Trygg i Trekantsparken kommer under projekttiden att använda sig av tre övergripande arbetsmetoder.

1. Att utföra *inventeringar runt Trekanten* i syfte att reda ut otrygghetsskapande komponenter samt reda ut vilka åtgärder som kan antas vara lämpliga i området.
2. Att ha en *dialog med boende i området, föreningar, företagare, skolor, förskolor mm* samt försöka få dessa grupper att aktivt medverka i projektet. Detta i syfte att reda ut otrygghetsskapande komponenter runt sjön samt få förslag och idéer kring vilka åtgärder som kan antas vara lämpliga för att uppnå projektmålen.

3. Att *samarbeta med sakkunniga* inom områdena prevention, bevakning, genusforskning, ekologi, parkexploatering, belysning mm. Detta i syfte att reda ut otrygghetsskapande komponenter samt få förslag och idéer kring vilka åtgärder som kan antas vara lämpliga för att uppnå projektmålen.

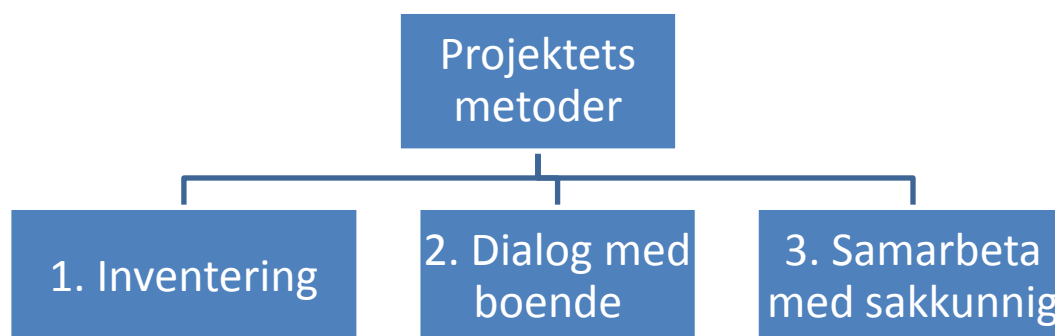

Figur 4: Projektets metoder

4.1 Inventering

Det huvudsakliga syftet med inventering av naturområdet runt Trekanten är att studera vilka områden som upplevs som otrygga och varför de upplevs som otrygga. Projektet kommer således vid inventeringar runt sjön Trekanten att lägga fokus på detta. Vid inventering av området kommer även projektet att titta på vad man kan göra för att komplettera parkområdet runt sjön. Det innebär bland annat att projektet kommer att titta på vad man kan göra för att komplettera fruktparken samt doftparken.

För att ta reda på vad det är som skapar otrygghet runt sjön och hur naturområdet kan förbättras kommer projektet göra följande.

1. Utföra närområdes-/trygghetsvandringar. Vid planerade vandringar kommer en rad punkter att studeras och dokumenteras.

Några punkter projektgruppen kommer att studera vid inventering av området är:

- Vad det är som skapar otrygghet i området och framförallt vad det är som gör att kvinnor upplever området som otryggt.
- Hur pass bra genomsiktligheten är från olika platser i området.
- Växtlighetens skick och ifall den bör omgrupperas.


- Belysningens placering och vilka möjligheter det finns att komplettera den befintliga belysningen i området.
- I vilket skick parkbänkarna, skyltarna och papperskorgarna är samt hur de kan upprustas och skyddas bättre.
- Gångvägar samt vilka alternativ till gångvägar som finns.
- Vilka mindre fysiska förändringar och åtgärder som kan vidtas i parken.
- Att börja skissera kring vilka möjligheter och idéer det finns till att skapa fler aktiviteter i Trekantsparken samt i området runt sjön.

Under närområdesvandringar kommer foton att tas och allt att dokumenteras. Ett genomgripande genusperspektiv kommer att tas hänsyn vid under närområdes-/trygghetsvandringarna. Alla förslag och all form av vandalisering etc. kommer att dokumenteras.

2. Studera de tidigare planer och projekt som initierats samt genomförts för Trekantsområdet. Detta ur ett genusperspektiv.

3. För att få en bra uppfattning vad det är som skapar otrygghet i parker och i bostadsområden intill parker kommer projektet att studera tidigare genomförda trygghetsprojekt ämnade att göra parkområden säkrare. Vid genomgång av tidigare parkprojekt kommer syften, metoder samt uppnådda resultat främst att studeras.

4. Gå igenom statistik över området. Framförallt kommer brotts- och trygghetsstatistiken i områdena runt Trekanten att analyseras och jämföras med andra liknande områden i Stockholm.

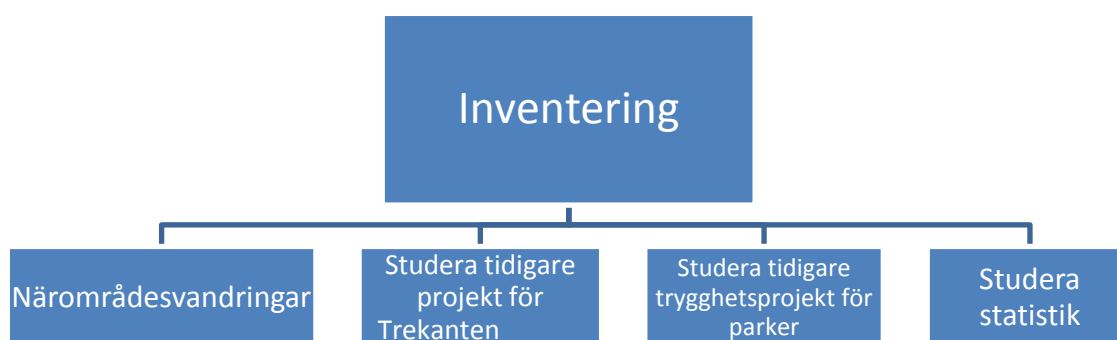

Figur 5: Arbetsmetoder vid inventering

4.2 Dialog

För att reda ut vad det är som skapar otrygghet framförallt för kvinnor i området runt Trekanten samt vad man kan göra för att området ska upplevas som tryggare är samråd med medborgare av stor vikt. I projektet kommer därför bland annat:

- Medborgare
- Företagare
- Föreningar
- Skolor/förskolor
- Fritidsgårdar

i området att involveras. Vid samråd med medborgare kommer projektet att få en bredare förankring, bättre förklaringar till vad som skapar otrygghet och förslag på åtgärder till området. För att ta reda på otrygghetsskapande komponenter kommer projektgruppen att ha möten samt föra en varierad dialog med ovan nämnda grupper i Trekantsområdet. Framförallt gällande de otrygghetsskapande komponenterna och varför just kvinnor upplever otrygghet i området är det viktigt att ha en fördjupad dialog med boende nära sjön.

1. Samråd med medborgare kommer till viss del att utgöras av närområdesvandringar i Trekantsområdet och fokusgruppsmöten. Vid närområdesvandringar med medborgare planerar projektgruppen gå runt i området och diskutera vad det är som skapar otrygghet runt sjön Trekanten. Vid närområdesvandringar kommer deltagande att få föra fram synpunkter och förslag på hur området runt sjön kan förbättras. Vid fokusgruppsmöten kommer samtal ske med unga kvinnor boendes i områden i närheten av Trekanten. Unga kvinnor är den grupp i bostadsområdena runt Trekanten som upplever en mycket hög otrygghet. Därav är det viktigt att den gruppen kommer till tals i projektet.
2. Huvudsakligen kommer dialogen med företagare, föreningar och skolor och med förskolor att utgöras av möten samt även med en workshop. Vid möten kommer projektets syfte och mål att presenteras för mötesdeltagarna. Deltagarna kommer att få föra fram sina synpunkter på vilka otrygghetsskapande komponenter det finns i området samt föra fram idéer och förslag på hur området runt sjön kan bli tryggare.
3. Under workshop kommer deltagarna att få föra fram vilka förslag på aktiviteter som kan startas upp i Trekantsparken och vilka av de existerande aktiviteterna som kan förbättras. Idén med workshop är att det ska vara ett "brainstormingmöte" där projektgruppen efter workshop reder ut vilka förslag som kan bli tänkbara i framtiden. Under fokusgruppsmöten kommer diskussion att ske med unga kvinnor att boendes i närheten av Trekanten. Deltagarna kommer att få föra fram sina synpunkter på vilka

otrygghetsskapande komponenter det finns i området samt föra fram idéer och förslag på hur området runt sjön kan bli tryggare.

Förslag på nya aktiviteter och fysiska förändringar i parken med ett väl genomtänkt med genusperspektiv är de förslag som främst är önskvärda under personliga möten, fokusgruppsmöten samt under workshop.




Figur 6: Dialog

4.3 Samarbete med sakkunniga

För att få en bra uppfattning vad det är som skapar otrygghet i parker och få förslag till åtgärder som kan förändra och göra området runt sjön Trekanten tryggare kommer sakkunniga inom olika yrkesområden att samarbetas med. Projektet ämnar samarbeta med sakkunniga inom:

- Landskapsarkitektur
- Geologi och parkskötsel
- Kriminologi och brottsprevention
- Bevakning och övervakning
- Trafik och belysning
- Genusforskning

Projektgruppen kommer att utföra närområdes- och trygghetsvandringar samt ha personliga möten med sakkunniga inom ovan nämnda yrkesområden. Sakkunniga inom olika yrkesområden kommer att få komma med förslag på vad projektet kan göra för att öka den upplevda tryggheten i området. Sakkunniga inom olika yrkesområden kommer att få bedöma vilka förslag i området som är realiserbara och ifall de bör uppnå de uppsatta projektmålen.



Figur 7: Samråd med sakkunniga

Projektgruppens inventering, dialog och närområdesvandringar med aktiva i området samt ett nära samarbete med sakkunniga kommer ge ett bra underlag för hur området runt Trekanten kan bli tryggare för såväl män som kvinnor.

5. ÅTGÄRDSPLAN

Efter genomförd inventering och sammanställning av förslag från projektgruppen, förslag från medborgare och andra intressentgrupper samt konsultering med kompetenta inom olika områden kommer en åtgärdsplan för projektet att skrivas. Åtgärdsplanen kommer att innehålla förslag på åtgärder och förändringar som syftar på att uppfylla de två projektmålen. Exempelvis kommer åtgärdsplanen att innehålla förslag på aktiviteter som till viss mån vill förändra parkens karaktär. Detta för att den upplevda tryggheten ska öka. Alla förslag i åtgärdsplanen kommer troligen inte att kunna implementeras. De förslag på åtgärder som står skrivna i åtgärdsplanen för naturområdet är ej säkerställda löften som helt säkert kommer att implementeras i området runt Trekanten.

6. AVGRÄNSNINGAR & EKONOMISKA RAMAR

Projekttiden är uppsatt från 1:a april till 31:a oktober, 2010. Då projekttiden är på sju månader är valet av åtgärder att genomföra för att uppnå projektmålen relativt begränsade. Projektets budget, vilket är på 420 000 kronor, gör också att fysiska åtgärder i parken som skulle kunna öka den upplevda tryggheten ej är möjliga att rymma inom den ekonomiska ramen.

Under projekttiden kommer:

- Inte några större fysiska förändringar att genomföras i området. Detta ansvarar exploateringskontoret i Stockholm för. Projektets budget täcker inte heller större fysiska förändringar.
- Inte några större avverkningar av träd och buskage att ske. Även om det skulle kunna öka den upplevda tryggheten i området så inskränker sådana åtgärder för mycket på den befintliga skötselplanen för Trekanten.
- Ingen nybyggnation planeras eller påbörjas i området. Detta ansvarar exploateringskontoret för.

7. PROJEKTORGANISATION


Initiativ till projektet har tagits av lokala brottsförebyggande rådet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i H-L (Hägersten-Liljeholmens) stadsdelsförvaltning är styrgrupp åt projektet. I lokala BRÅ sitter bland annat representanter för stadsdelsnämnd, polis, skola och stadsdelsförvaltning.

Referensgrupp till projektet är "Gruppen för Tryggare Centrum". I gruppen för tryggare centrum sitter bland annat representanter för polis, SL, exploateringskontoret och Citycon (centrumägare för Liljeholmstorget) samt avdelning för samhällsplanering på H-L sdf.

7.1 Bemanning

Följande kommer att bemanna rollerna i projektorganisationen

Roll	Namn	Förvaltning/Avdelning
Beställare Projektledare Styrgruppens ordförande		Boverket/Länsstyrelsen Hägersten-Liljeholmen sdf Ordförande H-L sdn
Projektgrupp	Magnus Hansson Anna William-Olsson Anna Ambjörn	Hägersten-Liljeholmens sdf Hägersten-Liljeholmens sdf Hägersten-Liljeholmens sdf Preventionscentrum Sthlm Skärholmens närpolis
Styrgrupp		Hägersten-Liljeholmens sdf Hägersten-Liljeholmens sdn Skärholmens närpolis Utbildningsförvaltningen
Referensgrupp		Trafikkontoret Ägare för Liljeholmstorget Vuxenheten H-L sdf Avd för samhällspl. H-L sdf SL Skärholmens närpolis Securitas Systembolaget

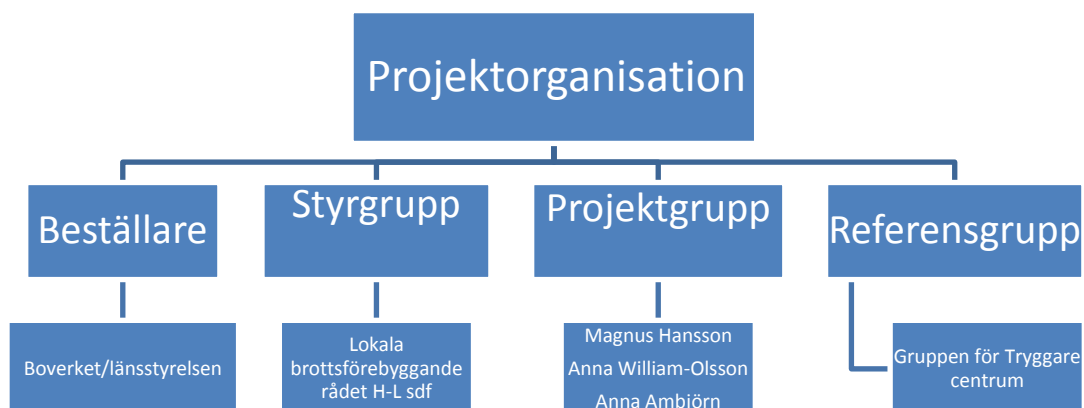

Figur 8: Projektorganisation

Projektgruppen till *Trygg i Trekantsparken* kommer kontinuerligt att ha möten angående projektet.

Under möten med lokala BRÅ i H-L sdf (styrgruppen) kommer projektplan samt åtgärdsplan att antas.

Referensgruppen kommer att träffa projektgruppen under ”Tryggare centrummöten” vilka arrangeras ca en gång i månaden. Under möten med referensgruppen kommer bland annat otrygghetsskapande komponenter i området runt Trekanten att diskuteras samt vad man kan göra för att åtgärda detta.

8. KVALITETSSÄKRING

För att säkerställa att projektet uppfyller projektmålen väl kommer:

- Alla involverade i projekt, ”Trygg i Trekantsparken”, att tydligt informeras om projektets syfte och målsättningar samt projektets arbetsmetoder.
- Alla möten, fokusgruppsmöten samt närområdes-/trygghetsvandringar att dokumenteras. Dokumenten kommer att vara lättöverskådliga, där projektgruppen är tydlig med vad vi har för tankar.
- Alla beslut tagna inom projektet att dokumenteras väl samt följas upp för att se om de gett effekt och följt projektmålen.

- Information om projektet att läggas upp på Stockholms stads intranät samt på Stockholms stads hemsida. Närområdesvandringar för allmänheten kommer att annonseras väl.
- Projektledaren kontinuerligt under projektets gång att stämma av med styrgruppen, med avdelningschefen, med parkingenjören (H-L sdf) och med projektgruppen angående de åtgärder som planeras tas i bruk.

9. RISKER

- En risk som kan uppstå under projektets gång är att konflikter uppstår mellan olika intressen som är involverade på ett eller annat sätt i projektet.
- En ytterligare risk är att informationsspridningen om projektets olika aktiviteter inte framkommer tillräckligt väl till alla involverade aktörer.
- Risk finns också att aktörer och intressenter som skulle kunna bistå med viktig information till projektet inte blir informerade om projektet.

10. TIDSPLAN

Aktivitet	Ansvarig	Tidsåtgång	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum
Planeringsmöte med Projektgrupp	Alla	2	2010-04-16	2010-04-16	
Upprättande av projektplan	PL	25	2010-04-10	2010-06-04	
Klar dokumentation av Trekanten (lyktor, parkbänkar etc.)	PL	25	2010-04-22	2010-06-08	
Möte Hotellhem Nybohov	PL	4	2010-04-28	2010-05-10	
Möte Polisen, Securitas &	PL	4	2010-04-27	2010-05-12	
Checkpoint/	Anna W-O	2	2010-	2010-	

avstämningsmöte	& PL		05-28	05-28	
Närområdesvandring Trekanten	PL	8 (varav 6 för planering)	2010-04-26	2010-06-03	
Antagande av projektplan	Lokala BRÅ	1	2010-06-04	2010-06-04	
Projektstartsmöte	PL	2	2010-06-09	2010-06-07	
Sammanställa förslag från boende vid närområdesvandring		6	2010-06-04	2010-06-30	
Checkpoint/avstämningsmöte	Anna W-O, polisen & PL	2	2010-06-24	2010-06-24	
Upprättande av åtgärdsplan	PL	40	2010-06-04	2010-10	
Budgetmöte	Controller, PL	2	2010-06-14	2010-08-13	
Fokusgruppsmöte	PL & Anna W-O	8 (varav 6 för planering)	2010-06-16	2010-08-16	
Checkpoint/avstämningsmöte	PL	2	2010-08-26	2010-08-26	
Antagande av åtgärdsplan	Lokala BRÅ	4	2010-10	2010-10	
Workshop	PL	8 (varav 6 för planering)	2010-06-08	2010-09-26	
Genomförande av åtgärder	Alla	60	2010-08	2011-10	
Upprättande av slutrapport	PL	40	2010-09	2010-10-31	
