
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2017-03-08	Upprättad av: Christer Johansson
		Bilaga: Datum (åååå-mm-dd):	

Projekt n: Adress: (ev.	Reinvestering Gullmarsplan, Renovering av fogar Trafikplats Gullmarsplan/ Johanneshov Projektnummer enligt kontoplan: (huvudprojekt nr anges först)
	H8000305
	8002457

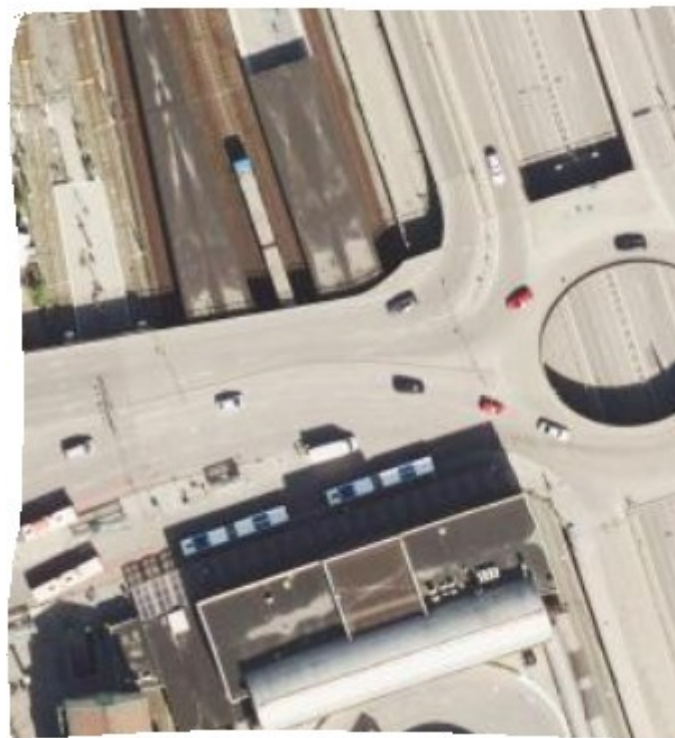

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
		namnteckning och namnförtydligande	<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	
Startbeslut	2015-04-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-04-12	Michael Åhström	900.000:-	900.000:-	
	Datum 2017-03-08	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr 1.131.772:-	<i>Namnförtydligande</i>		+ 231.772:-	+231.772:-
		Christer Johansson			

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				2016				2017				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad																				

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede		Anläggning
Ansvarig:	Projekteringskede	Lars Matz	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Lidén	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	
Projektet är samordnat med: Trafikplanering, Andreas Zeilon och Christer Liljegren	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Målet var att säkerställa övergångskonstruktionernas (fogarnas) funktion och förlänga livslängden på dessa så att trafikanterna kan förflytta sig över bron på ett säkert sätt
--

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Byte av trasiga stålprofiler, tätningsprofiler samt påsvetsning av slitstål.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	All trafikstörande verksamhet skedde nattetid.
Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år ...2016....)	
Övrigt:	
