

Handläggare
Niklas Ymerson
08-508 876 28**Till**
Exploateringsnämnden
2021-02-18Daniel Gleimar
08-508 876 11

Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 inom Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden med Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB och Bonnier Fastigheter AB. Genomförandebeslut

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 omfattande investeringsutgifter om 981 mnkr och investeringsinkomster om 15 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.
2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Niam VI Neapel 3 AB avseende tomträtten Neapel 3 samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse om exploatering träffas och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.
3. Exploateringsnämnden godkänner partsbyte för markanvisningen inom fastigheten Hangö 1 med Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB och Niam VI Neapel 3 AB enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.
4. Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9,

Exploateringskontoret
Stora projektFleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 876 28
Växel 08-508 276 00
niklas.ymerson@stockholm.se
exploateringskontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 till Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB och Bonnier Fastigheter AB med en försäljningsinkomst om cirka 796 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Sara Lundén
Avdelningschef

Staffan Lorentz
Enhetschef

Sammanfattning

Södra Värtan är ett delområde i Värtahamnen som ingår i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Det är indelat i tre olika detaljplaneområden och Södra Värtans Norra del utgör områdets första utbyggnadsetapp. Projektet syftar till att möjliggöra uppförande av ny kommersiell bebyggelse utgörande kontor och centrumändamål inom fem kvarter i anslutning till hamnverksamhet. Totalt tillskapas cirka 110 000 kvm BTA ny kommersiell bebyggelse och tillskapande av cirka 7 300 nya arbetsplatser. Projektet ska även tillskapa nya offentliga rum och allmänna platser, ny kaj och pir samt ny brygga för att möjliggöra kollektiv till sjöss.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar negativt nettonuvärde om -193 mnkr för Södra Värtans Norra del. Projektet Södra Värtan som helhet, där föreliggande genomförandebeslut för Norra delen ingår, bedöms fortsatt medföra ett positivt resultat och nettonuvärde för staden i enlighet med det som presenterats i Södra Värtans reviderade inriktningsbeslut (antaget av KF 2020-06-15).

Lönsamhetskalkylen redovisar ett positivt nettonuvärde om 544 mnkr för projektet Södra Värtan som helhet inklusive hela stadens investeringar.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 981 mnkr. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 78 % procent. Försäljningsinkomster beräknas till cirka 796 mnkr.

Expertrådet har godkänt ärendena 2016-03-03 (Dnr E2015-03519), 2016-06-02 (Dnr 2015-03519, Dnr E2015-03141) och 2020-02-13 (Dnr E2019-03315).


Avstämning har skett med stadsledningskontoret.

Exploateringskontoret bedömer att utbyggnad av etappen norra delen av Södra Värtan överensstämmer väl med stadens mål enligt översiktsplan och stadens Vision 2040 samt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Projektet har goda förutsättningar att medföra ett välbehövligt tillskott av kommersiell bebyggelse för kontor och centrumändamål i ett bra kommunikationsläge samtidigt som det ökar områdets attraktivitet och säkerhet. Utbyggnaden av norra delen av Södra Värtan är en förutsättning för att möjliggöra bostadsbebyggelse, skola, förskolor och kommersiell bebyggelse i kommande utbyggnadsetapper inom Södra Värtan.

Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden för sin del godkänner överenskommelse om exploatering samt föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden genom exploateringskontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och de markanvisade byggaktörerna samt tomträttshavare inom detaljplanen norra delen av Södra Värtan samt träffa erforderliga avtal med en försäljningsinkomst om cirka 796 mnkr.

Bakgrund till överenskommelsen

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde där det planeras minst 12 000 nya bostäder och ca 35 000 nya arbetsplatser. Inom stadsutvecklingsområdet ligger Värtahamnen, som tidigare har kallats Södra Värtahamnen. Det består i sin tur av totalt tre delområden Södra Värtan, Valparaiso och Värtapiren som tillsammans omsluter en hamnbassäng. Delområdena utgör tre egna projekt som har enskilda inriktningsbeslut. Projektens totalekonomi (total budget för Värtahamnen) har redovisats vid tre tidigare beslutstillfällen.

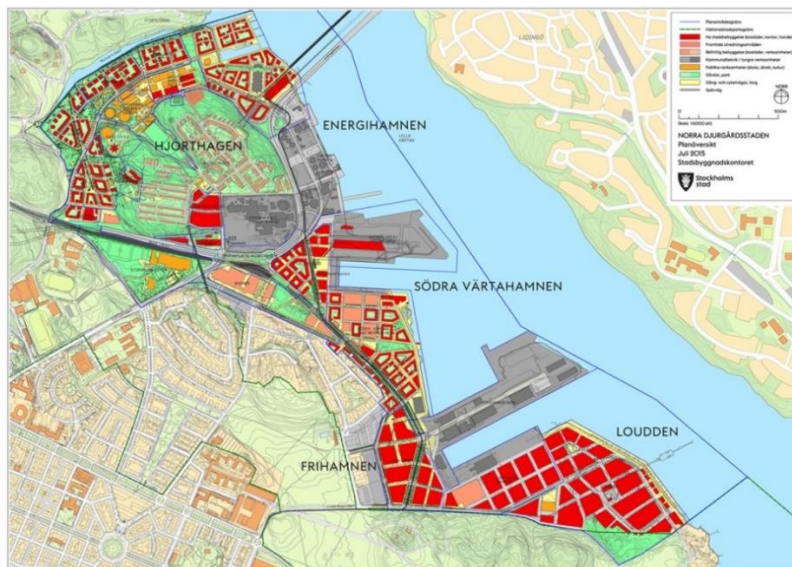

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.




Värtahamnen är indelat i tre delområden, Södra Värtan, Valparaiso och Värtapiren.

Projektet Södra Värtan utgör en del av Värtahamnen och detaljplanearbete har pågått sedan formell planstart år 2015. Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt för industriändamål. Inom området finns befintlig infrastruktur och ett antal befintliga byggnader med kommersiella verksamheter, som till största del kommer att vara kvar.

Södra Värtan planeras nu bli en ny blandad stadsdel med innehåll av både kontor och bostäder samt utbud av service med handel, skola och förskolor. Området kommer också ha ett levande kajstråk, parker och torg.

Södra Värtans detaljplan har efter samråd mellan december 2016-februari 2017 indelats i tre etapper: Södra delen, Mellandelen, och Norra delen som nu väntas bli den första detaljplanen som antas. Detaljplanen har namnet Detaljplan för Neapel 3 mfl i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2018-00406 och har godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2020-12-10. Beslut om detaljplanen och dess genomförande planeras kunna antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet år 2021.

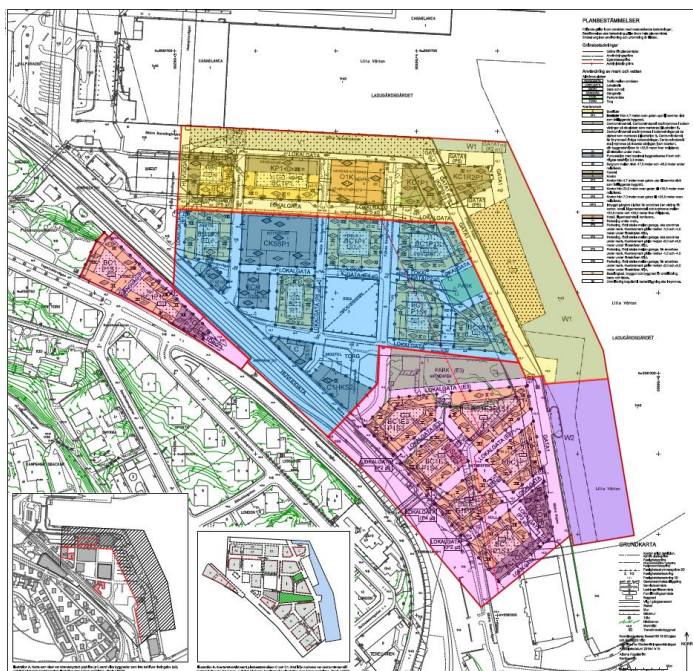

Södra Värtans detaljplaneförslag, samrådshandling. Förslag till etappindelning, norra, mellersta och södra delen. Södra och norra delen har bearbetats vidare efter samråd.

År 2019 reviderades Södra Värtans inriktningsbeslut och en uppskattning av ca 1500 bostäder planeras i hela Södra Värtan samt nya lokaler som innefattar skola, förskolor, centrumändamål, kontor och hotell. Mängden lokaler planeras utökas med totalt ca 156 000 kvm för hela Södra Värtan. Antal planerade förskoleavdelningar om totalt 20 stycken inom planområdet. Det finns 14 markanvisade aktörer inom Södra Värtans detaljplaneförslag varav majoriteten finns i Södra delen. Mellandelen är till största del ännu inte markanvisat. Två förskolor är markanvisade till privata aktörer i södra delen, varav en ska köpas in av Fastighetskontoret och drivas i kommunal regi. I Södra Värtan finns även en privat fastighetsägare samt fyra stycken tomträttshavare varav en ingår i den Norra delen.

Södra Värtans norra del

Södra Värtan har historiskt dominerats av hamnverksamhet med oljecisterner och lagerbyggnader men under senare decennier har området ändrat karaktär. Den norra delen, som är Södra Värtans första etapp, utgörs redan idag av en större kontorsbyggnad samt hotell. Projektet syftar till att möjliggöra uppförande av ny kommersiell bebyggelse utgörande kontor och centrumändamål samtidigt som delar av bebyggelsen med hotell och kontor bevaras. Inom del av fastigheten Neapel 3 som är upplåten med tomträtt ska befintlig kontorsbyggnad om 27 000 kvm rivas och ersättas med ny kommersiell bebyggelse om ca 38 000 kvm. Därutöver uppförs ny kommersiell bebyggelse om ca 72 000 kvm på mark som ska försäljas. Totalt uppförs 110 000 kvm ny kommersiell bebyggelse vilket motsvarar ca 7 300 nya arbetsplatser. Planområdets bebyggelse vetter mot den norra kajen och består av fem olika kvarter i något varierande storlek. Mellan kvarteren går lokalgator i nord-sydlig riktning som delvis försörjer befintlig bebyggelse. Gatorna ansluter till Hangövägen som befintlig lokalgata i öst-västlig riktning.



Illustrationsplan över utbyggt planområde med ungefärlig avgränsning. Källa: AJ Landskap och Stadsbyggnadskontoret

Den pågående hamnverksamheten i Värtahamnen medför verksamhetsbuller och för att möjliggöra den planerade bebyggelsen för samtliga etapper i Södra Värtan behöver bullret skärmis av norrifrån vilket är ett av motiven till att bygga högre byggnadsvolymer mot norr. I planområdets östra del tillskapas ny landmassa med hjälp av konstruktioner och utfyllnad i vattnet. Denna benämns Saltpiren och delar av en byggnaden benämnd Pirhuset planeras att byggas här. Utbyggnad av Saltpiren och

Pirhuset är en viktig förutsättning för kommande etapper eftersom den avskärmar verksamhetsbuller från de yttre, östra delarna av Värtapiren i Värtahamnen och möjliggör därmed kommande bostadsbebyggelse och skola i Södra Värtan. Söder om Pirhuset föreslås ett torg med trappor ner mot vattnet. Längst östra kajlinjen föreslås ett promenadstråk ner mot Värtanbryggan som kommer vara utgångspunkt för kollektivtrafik till sjöss. Söder om Värtanbryggan ska en teknikbyggnad uppföras för VA-ändamål.



Befintligt område som ingår Södra Värtans Norra del, Detaljplan för Neapel 3 mfl i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Tidigare beslut

Det har för Södra Värtan fattats två stycken tidigare genomförandebeslut:

2016-09-26 fattades genomförandebeslut i kommunfullmäktige om ca 230 mnkr för ombyggnad av Södra Kajen, den del av kajläget som ligger längst söder i Södra Värtan. Arbetena är färdigställdes 2019 och var nödvändiga då kajen var i dåligt skick. Projektet är slutredovisat till en kostnad om 220 mnkr.

2020-06-15 fattades genomförandebeslut i kommunfullmäktige om ca 132 mnkr för arbeten med ledningsomläggningar i Hangövägen inom Södra Värtans norra del. Arbetena görs i samband med att en stor dagvattenkulvert nyförläggs i Hangövägen och Andra Bassängvägen. Dagvattenkulverten är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms hamnar, Stockholm vatten

och avfall och exploateringskontoret och ska huvudsakligen avvattna närliggande kv. Valparaiso.

Urval över tidigare beslut berörande Södra Värtan (inkluderat besluten ovan):

EXPLN 2009-12-17 Inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtan och genomförandebeslut för Värtapiren

KF 2012-05-28 Reviderat inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtan och genomförandebeslut för Värtapiren

EXPLN 2016-03-10 Markanvisning för kontor mm inom fastigheterna Hangö 1, Bristol 1 och del av Ladugårdsgärdet 1:9, 1:40, Neapel 3 och Antwerpen 2 i Norra Djurgårdsstaden till Bonnier Fastigheter AB

EXPLN 2016-06-09 Avtal med Niam VI Neapel 3 AB rörande exploatering, markanvisning m.m. inom fastigheterna Neapel 3, Hangö 1 och Pireus 1 inom Södra Värtan.

KF 2016-09-26 Reviderat inriktningsbeslut för Södra Värtan och genomförandebeslut för Södra kajen

EXPLN 2020-02-20 Markanvisning för kontor inom fastigheten Hangö 1 på Östermalm till Niam VI Neapel 3 AB

KF 2020-06-15 Reviderat inriktningsbeslut för Södra Värtan och genomförandebeslut för del av Hangövägen

SBN 2020-12-10 Godkännande av förslag till detaljplan för Neapel 3 m.fl. i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2018-00406 (kontor, centrumändamål, torg, hamnverksamhet). Södra Värtan etapp 1

Partsbyte för markanvisning inom fastigheten Hangö 1

Exploateringskontoret har år 2020 markanvisat Niam VI Neapel 3 AB för uppförande av 7 000 kvm kontor inom fastigheten Hangö 1. Enligt markanvisningsavtalet framgår att Niam VI Holding AB åtar sig gentemot staden att solidariskt med Niam VI Neapel 3 AB ansvara för fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt markanvisningsavtalet och enligt sådan

överenskommelse om exploatering som staden och Niam VI Neapel 3 AB kan komma att ingå för markområdet.

Ägaren till bolaget Niam VI Neapel 3 AB önskar att bolaget Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB ska överta markanvisningen inom fastigheten Hangö 1 och genomföra exploateringen och därmed utgöra avtalspart vid tecknandet av exploateringsöverenskommelse. Önskemål har också framförts om att borgensåtagandet från Niam VI Holding AB ska ersättas med ett motsvarande borgensåtagande från Niam VII Holding AB. Ett avtal om partsbyte har träffats mellan parterna Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB, Niam VII Holding AB, Niam VI Neapel 3 AB, Niam VI Holding AB och staden gällande partsbytet, villkorat av exploateringsnämndens beslut.

Avtalet om partsbyte innebär att parterna är överens om att Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB, från och med dag för undertecknande av avtal om partsbyte och på de villkor som framgår av markanvisningsavtalet, inträder som part i markanvisningsavtalet i Niam VI Neapel 3 AB ställe. Det innebär att samtliga rättigheter och skyldigheter enligt markanvisningsavtalet övergår från Niam VI Neapel 3 AB till Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB. Genom avtalet om partsbyte övertar Niam VII Holding AB borgensåtagandet från Niam VI Holding AB.

Överenskommelse om exploatering

Totalt kommer fyra exploateringsöverenskommelser att tecknas, två stycken med Bonnier Fastigheter AB, en med Niam VI Neapel 3 AB och en med Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB enligt föreslaget beslut. Den överenskommelse om exploatering som tecknas med Niam VI Neapel 3 AB berör en befintlig tomträtt där en byggnad ska rivas och en ny, större byggnad, ska uppföras. I samtliga exploateringsöverenskommelser regleras delvis frågor kring genomförandet som t.ex. marksanering, produktion och samordning. Det regleras även frågor som är av stadigvarande betydelse när detaljplanen är utbyggd som t.ex. anslutningar till vatten och avlopp, avfallshantering, gemensamhetsanläggningar samt nyttjanderätter som ska gälla mellan parterna och servitut som ska bildas för fastigheterna. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens miljöprofilområden och har ett särskilt Miljö- och hållbarhetsprogram (Program för hållbar stadsutveckling) som antogs av kommunfullmäktige 2017. För varje delområde och utbyggnadsetapp har det

utarbetats fram specifika hållbarhetskrav i ett handlingsprogram, där målen och åtgärderna från övergripande Miljö- och hållbarhetsprogram konkretiseras. Samtliga byggaktörer har tidigare åtagit sig att efterfölja ett handlingsprogram med hållbarhetskrav, vilken utgör en bilaga till exploateringsöverenskommelserna.

Expertrådet har godkänt ärendena 2016-03-03 (Dnr E2015-03519), 2016-06-02 (Dnr 2015-03519, Dnr E2015-03141) och 2020-02-13 (Dnr E2019-03315).

Överenskommelse om exploatering för tomträtten Neapel 3

Fastigheten Neapel 3 är upplåtet med tomträtt till Niam VI Neapel 3 AB för hotell- och kontorsbebyggelse. En del av tomträtten ska utvecklas, vilket medför att en befintlig kontorsbyggnad på cirka 27 000 kvm BTA rivs och en ny kommersiell bebyggelse uppförs med cirka 38 000 kvm BTA på samma yta. Exploateringskontoret tecknade år 2016 en överenskommelse med Niam VI Neapel 3 AB gällande den framtida exploateringen inom tomträtten, där det även beslöts om att tomträtten ska inskränkas och att ett visst markområde ska överföras till staden. I överenskommelsen framgick även hur avgälden i framtiden ska regleras. I samband med överenskommelsen markanvisades Niam VI Neapel 3 AB för bostadsbebyggelse inom fastigheten som avsågs att friköpas. I ett senare tillägg till överenskommelsen som tecknades år 2018 har det avtalats om att den del som planerades för bostadsbebyggelsen, istället ska bebyggas med kommersiell bebyggelse och att markanvisningen därför ska utgå. Anledningen är att det konstaterats att bostäder inte är möjligt att uppföra med hänsyn till trafik- och verksamhetsbuller från angränsande hamnverksamhet.

År 2018 tecknades sidoavtal och tillägg till tomträttsavtal med Niam VI Neapel 3 AB om framtida avgäldsreglering med reduktion för tomträtten. Enligt överenskommelsen från år 2016 och tillägg till överenskommelsen från år 2018 ska den utökade byggrätten vara avgäldsbefriad i högst 20 år från och med att detaljplan vunnit laga kraft. I samband med antagandet av den nya detaljplanen ska en exploateringsöverenskommelse upprättas med tomträttshavaren Niam VI Neapel 3 AB som hanterar frågor kring genomförandet av exploateringen samt hanterar ingångna avtalsvillkor.

Överenskommelser om exploatering med överlåtelse av mark

Exploateringskontoret har år 2016 markanvisat del av fastigheterna Neapel 3, Ladugårdsgärdet 1:9 och Ladugårdsgärdet 1:40 till Bonnier Fastigheter AB för uppförande av cirka 50 000 kvm BTA ny kommersiell bebyggelse. Ladugårdsgärdet 1:40 är idag ett vattenområde där ny mark ska tillskapas genom utfyllnad av massor. Det tillskapade markområdet benämns Saltpiren och ska både bebyggas med kontor samt nya allmänna ytor intill vattnet. För att hantera genomförandet av exploateringen tecknar staden en exploateringsöverenskommelse med Bonnier Fastigheter AB för den kommande bebyggelsen.

Exploateringskontoret har år 2016 markanvisat Bonnier Fastigheter AB för uppförande av ny kommersiell bebyggelse utgörande cirka 15 000 kvm BTA inom fastigheten Hangö 1. Eftersom kvarteret delas mellan två byggaktörer ställs krav på samordning mellan aktörerna. För att hantera genomförandet av exploateringen tecknar staden en exploateringsöverenskommelse med Bonnier Fastigheter AB för den kommande bebyggelsen.

År 2016 har exploateringskontoret markanvisat Niam VI Neapel 3 AB för uppförande av ny 6 000 kvm ljus BTA bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Hangö 1. Under planarbetet har det konstaterats att bostadsbebyggelse inte är möjligt att uppföra, då det konstaterats att bostäder inte är möjligt att uppföra med hänsyn till trafik- och verksamhetsbuller från angränsande hamnverksamhet. Exploateringskontoret har därför år 2020 markanvisat Niam VI Neapel 3 AB för uppförande av cirka 7 000 kvm BTA kommersiella lokaler inom fastigheten Hangö 1. Eftersom kvarteret delas mellan två byggaktörer ställs krav på samordning mellan aktörerna. För att hantera genomförandet av exploateringen tecknar staden en exploateringsöverenskommelse för den kommande bebyggelsen med den nya parten Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB enligt föreslaget beslut.

Ekonomiska konsekvenser för staden

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet (Södra Värtan, Norra delen) enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. Projektet och kalkylen ingår som en del av det reviderade inriktningsbeslutet för projekt Södra Värtan som antogs i KF 2020-06-15. Inga större

justeringar har gjorts i kalkylen till föreliggande genomförandebeslut, jämfört med den kalkyl som låg till grund för projektet Södra Värtan som helhet enligt det reviderade inriktningsbeslutet som antogs i KF 2020-06-15.

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter.

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett negativt nettonuvärde om ca -193 mnkr motsvarande -232 tkr/ekvivalent lägenhet¹.

Majoriteten av kvartersmarken kommer att säljas med uteslutande ändamål för kommersiella lokaler. Befintlig tomträtt av fastigheten Neapel 3 kommer delvis att inskränkas för att möjliggöra markförsäljning och byggnation av Saltpiren och Pirhuset. En del av befintlig kontorsbebyggelse inom Neapel 3 kommer att rivas och ersättas med ny kontorsbebyggelse.

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 981 mnkr. Utgifterna avser främst utbyggnaden av ny kaj och pir, samt markrening.

Inkomsterna beräknas till ca 15 mnkr, varav huvuddelen utgörs av vidarefakturerings till ledningsägare för ledningsomläggning, samt vidarefakturerings till byggaktörer för schaktning och spont på kvartersmark. Försäljningsinkomster som avser mark för byggande av kommersiella lokaler beräknas till ca 796 mnkr och reavinsten beräknas uppgå till ca 785 mnkr.

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till ca 963 tkr i fast prisnivå. Detta nyckeltal visar projektets nettoutgifter. Projektets täckningsgrad beräknas uppgå till 78 procent.

All ekonomisk risk avseende byggaktörernas del av projekteringen står de själva för. Staden har risk för förgävesprojektering.

¹ Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm BTA).

Budgetkonsekvenser

Investeringsbudget och försäljningsinkomster

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 981 mnkr och investeringsinkomsterna till ca 15 mnkr i löpande prisnivå.

Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell:

Budgetkonsekvenser	Ack						
Investering	t.o.m.						
Mnkr	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	Totalt
Utgifter inkl. förvärv (-)	0,0	0,0	-16,9	-162,0	-182,5	-619,2	-980,6
Inkomster (exkl. försäljning)	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	9,5	15,1
Nettoutgift (-) /-inkomst	0,0	0,0	-16,9	-159,2	-179,6	-609,8	-965,5
Försäljningsinkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3	528,9	796,3

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2021. Behov av medel för åren därefter får beaktas i nämndens kommande budgetarbete.

Driftbudget

Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående tabell.

Budgetkonsekvenser							
Drift							
Mnkr	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	Kom- mentar
Resultatpåverkan ExplN							
Löpande intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max 0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -4,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	max -24,5	år 2027
Reavinster/förluster	0,0	0,0	0,0	257,0	528,2	0,0	totalt 785,3
Summa resultatpåverkan nämnd	0,0	0,0	0,0	257,0	528,2		
Resultatpåverkan TRN+SDN							
Driftskostnader TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,4	-1,2	mellan -1,3 och -1,7	
Underhållskostnader trafiknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	mellan 0 och -1,5	
Summa resultatpåverkan TRN+SDN	0,0	0,0	0,0	-0,4	-1,2		

De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 3 mnkr. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden

beräknas uppgå till ca 29 mnkr det första året och minskar därefter något genom avskrivningar. Reavinsten beräknas uppgå till ca 785 mnkr.

Ekonomiska osäkerheter

Det finns ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer kopplade till genomförandet av projektet (se Risker och Osäkerheter). En risk- och osäkerhetsanalys enligt successivprincipen har genomförts för utbyggnaden av Saltkajen, Saltpiren och Värtanbryggan, vilka tillsammans står för ca 80 % av utgifterna i projektet. De största osäkerhetsposterna som identifierats med risk för betydande fördyringar är knutna till arbeten för dubbelspont, fyllning och påldäck för utbyggnaden av Saltpiren, samt utbyggnaden av Saltkajen och muddring av massor i vatten. Skillnaden mellan maximal uppskattad utgift och trolig utgift för dessa arbeten uppgår till 245 mnkr. För att ta höjd för de stora risk- och osäkerhetsposterna i projektet har en reservpost om 15 % medtagits i kalkylen, motsvarande ca 130 mnkr i löpande prisnivå.

Markpriset är knutet till ett index som följer prisutvecklingen för kommersiella lokaler. Redovisade siffror i kalkylen bygger på markpriser som är indexerade. Prisutvecklingen för kommersiella lokaler får därför en direkt effekt på inkomsterna och nuvärdet.

Slutsats-ekonomi

Sammanfattningsvis kan konstateras att stadsutvecklingen i Södra Värtans Norra del redovisar ett negativt nettonuvärde för staden om ca -193 mnkr. Delprojektet innebär stora investeringar i framförallt utbyggnaden av ny pir och kaj. Majoriteten av kvartersmarken kommer att säljas, med uteslutande ändamål för kommersiella lokaler. Projektet Södra Värtan som helhet, dit föreliggande genomförandebeslut för Norra delen ingår, bedöms fortsatt inbringa ett positivt resultat och nettonuvärde för staden i linje med det som presenterats i Södra Värtans reviderade inriktningsbeslut (antaget i KF 2020-06-15). Ett positivt nettonuvärde om ca 544 mnkr bedöms projektet Södra Värtan som helhet inbringa, inräknat stadens alla investeringar (skola, gymnastiksal och förskolor). Detta inkluderar även tidigare genomförandebeslut i Södra Värtan.

Hur projektet uppfyller stadens mål

Bostadsbebyggelse

Exploateringskontoret har bedömt projektet Södra Värtan utifrån stadens vision, mål i stadens budget, översiktsplanen och övriga styrdokument.

Lokaler

Inom Norra delen av Södra Värtan planeras totalt för cirka 110 000 kvm ny kommersiell bebyggelse, vilket utgör större delen av hela Södra Värtans utökning av kommersiell bebyggelse som uppgår till cirka 156 000 kvm. Kommersiell bebyggelse kommer utgöra skärmande bebyggelse för de planerade bakomliggande bostäderna i Södra Värtans södra del och mellandel. Skärmande bebyggelse är planerad att uppföras i de lägen där buller från fartyg förväntas vara som högst. Det planeras även för lokaler i bostädernas bottenvåningar i kommande etapper.

Det planeras för en skola F-6 med tillhörande gymnastiksal samt 20 stycken förskoleavdelningar uppdelat på fem förskolor inom Södra Värtans södra del och mellandel.

Miljö

De miljökonsekvenser som har utretts är markföroreningar med hänsyn till att historisk industri- och hamnverksamhet har lett till att marken på många platser är förorenad. Det har utförts översiktliga markundersökningar och en riskbedömning med mätbara åtgärds mål är genomförd inför kommande marksanering. Inom området sker kontroll av yt- och grundvatten.

Kompensation för ianspråktagen grönyta

Planförslaget ianspråktar inga allmänna grönytor. Inom de kommande etapperna i Södra Värtan planeras det för nya parker.

Energihushållning

I enlighet med handlingsprogrammet för Södra Värtan, som konkretiserar de hållbarhetskrav byggaktörerna åtagit sig att efterfölja har dessa krav följts upp och redovisats under projekteringsskedet, vilket specificeras i handlingsprogrammet. Gällande energianvändning har Bolagen förbundit sig att vid projektering och byggande inom fastigheterna uppfylla krav i det framtagna handlingsprogrammet för Södra Värtan för energianvändning till högst 45 kWh/kvm per år för kontor.

Projekterade värden i programhandlingsskede avseende nettoenergi till högst 45 kWh/m² per år för kontor bedöms klaras av.

Under detaljplanprocessen har det kontinuerligt arrangerats kompetensprogram och forum för hållbara lösningar, då staden tillsammans med byggaktörerna deltagit för att få en ökad förståelse och sprida kunskap med exempel på lösningar som kan tillämpas för att efterfölja hållbarhetskraven. Exempel på olika teman av de kompetensprogram som ägt rum är: mobilitet och hållbara transporter, energi- och kretsloppssystem, inomhusmiljö, avfall- och avlopp i kretslopp samt klimatanpassning och grönskastruktur.

Sorterande avloppssystem

Bolagen har åtagit sig att planera och projektera för separerade avloppssystem för matavfall, svartvatten och gråvatten enligt handlingsprogrammet. Genom insamling och behandling av separata flöden kan större delen av resurserna i avloppsvattnet återvinnas. Systemet är projekterat för att byggas ut i hela Södra Värtan och planeras även för Valparaiso i Värtahamnen samt i Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Sorterande avloppssystem har bland annat byggts ut i Hamburg, Amsterdam och i Helsingborg.

Tillgänglighet

Gång- och cykeltrafik prioriteras i planförslaget prioriteras och området kommer utökas med cykelbanor och trottoarer genom utbyggnaden längs planområdets kajer och Hangövägen. All bilparkering planeras ske i garage under mark inom kvartersmark. Utvecklad kollektivtrafik både till sjöss och på land möjliggörs genom planförslaget.

Planering av den yttre miljön har skett och sker fortsatt för de kommande etapperna i Södra Värtan, med särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Exploateringen ska genomföras inom ramen för ”Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar utemiljö”. I samband med planprocessen för norra delen har tillgänglighetsfrågorna utretts. Tillgänglighetsfrågorna kommer fortsättningsvis utredas inom planprocessen för de kommande etapperna mellandelen och södra delen inom Södra Värtan. Intilliggande vistelseytor till den nya bebyggelsen och tillhörande entréer kommer vara tillgängliga för personer med nedsatt

rörelseförmåga. Området som bebyggs har mycket små terrängskillnader.

Påverkan på barn

I samband med planprocessen för området Södra Värtan har en social konsekvensanalys tagits fram där det ingått att studera planförslagets påverkan på barn och deras livsmiljö. I det reviderade förslaget föreslås en F-6 skola med tillhörande gymnastiksal uppföras centralt i exploateringsområdet i Södra Värtan. Skolan planeras intill en mindre planerad park i mellandelen och i närheten av en större planerad stadspark i södra delen.

Tillgänglig vistelseyta som är planerad för parken i mellandelen kommer förändras i det föreslagna området vid uppförande av en F-6 skola med tillhörande gymnastiksal. Under det fortsatta utredningsarbetet och planprocessen för mellandelen kommer det fastställas om ändrad omfattning och utformning av tillgänglig vistelseyta inom planområdet.

Utbyggnad av ny kaj och pir samt uppförande av ny bebyggelse utgörande kommersiell bebyggelse i form av kontor och centrumändamål inom norra delen av Södra Värtan, bedöms inte ha någon negativ påverkan på barn.

Jämställdhet

Norra delen av Södra Värtan innefattas av en blandning av olika verksamheter som i kombination med en trygg och levande stadsmiljö bidrar till ökad jämställdhet. Under hela genomförandetiden kommer projektet beakta samtliga trafikslag, kön och åldrar. Staden kommer informera om planerade och pågående genomförandearbeten och föra dialog med områdets berörda fastighetsägare, verksamhetsutövare, tomträttshavare, angränsande boende och allmänhet som besöker området.

Konstnärlig utsmyckning

I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens produktionskostnad avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. Exploateringskontoret har tillsammans med Stockholm konst år 2017 beslutat om konstprogram och tillhörande budgetkalkyl där enprocentsanslaget fastställts till 23 mnkr för Södra Värtan. Därefter har konstnärer valts ut för skissuppdrag. Totalt planeras fem olika konstverk i Södra Värtan varav två konstverk tillhör

Södra Värtans norra etapp. Dessa två inryms i kalkylen för projektets produktionskostnad.

Genomförandefrågor

Tidplan

Byggnation inom del av Hangövägen i Södra Värtan för stadens genomförandearbeten har påbörjats under år 2020 efter genomförandebeslut antagits av KF 2020-06-15.

Genomförandearbetena avser främst ledningsomläggningar, bland annat förläggning av en ny dagvattenkulvert (med 2 m i diameter).

Stadens genomförandearbeten för resterande del av området inom norra delen av Södra Värtan uppstartas under år 2021 och pågår till och med år 2026. Genomförandearbetena avser utbyggnaden av Saltkajen, Saltpiren och Värtanbryggan som bland annat innefattar arbeten för dubbelspont, fyllning och påldäck för utbyggnaden av Saltpiren, samt utbyggnaden av Saltkajen och muddring av massor i vatten. Markrening inom kommande kvartersmark och gatubyggnation för del av Andra Bassängvägen och Södra Bassängkajen samt för resterande del av Hangövägen utgörs också av dessa genomförandearbeten. Staden avser även uppföra en teknikbyggnad för VA-ändamål på Södra kajen som avser försörja kommande bebyggelse inom södra delen och mellandelen i Södra Värtan, för att minska och effektivisera genomförandetiden inom de kommande etapperna i Södra Värtan.

Norra delen av Södra Värtan byggs ut etappvis och kräver god samordning mellan stadens genomförandearbeten och bolagens produktion inom deras respektive kvarter. Byggstart för första kvarter planeras ske under år 2021 inom kvarter Neapel, som innefattar rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny kommersiell bebyggelse. Första inflyttning planeras ske tidigast år 2023 inom detta kvarter.

För de resterande kvarteren inom området planerar Bolagen sin byggstart till år 2023 för kvarter Hangö och år 2024 för kvarter Venedig/Palermo (Pirhuset). Tidigast inflyttning inom dessa kvarter bedöms ske år 2025. Under år 2027 avses hela norra delen av Södra Värtan vara fullt utbyggd och inflyttning skett till samtliga kvarter inom området.

Risker och osäkerheter

Södra Värtans norra del utgör ett delprojekt inom projektet Södra Värtan som sammantaget utgör ett komplext stadsutvecklingsprojekt.

Södra Värtans norra del är förenad med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer för genomförandet. Hela Södra Värtan är också förknippat med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer. Nedan beskrivs först riskerna för Södra Värtans norra del och sedan beskrivs riskerna för hela projektet Södra Värtan.

Risker för Södra Värtans norra del

Markföroreningar

I området har verksamheter bedrivits med bl.a. oljeprodukter och föroreningarna utgörs huvudsakligen av petroleumprodukter (aromater, alifater, PAH och BTEX). Även högre halter av tungmetaller förekommer ställvis. Utförda miljötekniska markundersökningar visar på allt från rena områden till områden med högre föroreningshalter.

En riskbedömning med mätbara åtgärds mål har tagits och samråd har skett med Länsstyrelsen kring hur föroreningarna ska hanteras. Kontrollprogram kommer att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten inför varje saneringsetapp.

För de olika projekten inom Norra Djurgårdsstaden schaktas massor med för höga föroreningshalter bort och vidare till Masslogistikcenter (MLC), som är beläget inom området Frihamnen, där massorna siktas och sorteras. De massor som återanvänds används till återfyllnad i projekten inom Norra Djurgårdsstaden och endast de utsorterade massorna transporteras till externa mottagningsanläggningar. Massor som har tillräckligt goda tekniska egenskaper och innehar halter som ligger inom ramen för de godkända mätbara åtgärds målen återanvänds inom området. Genom denna masshantering minskas antalet långa transporter och mängden massor som ska deponeras. De massor som innehar för höga föroreningshalter körs direkt vidare till externa mottagningsanläggningar.

Grundläggningsförhållanden

Grundläggningsförhållanden är en risk som tidigt identifierats inom projektet. Under detaljplaneprocessen har kompletterande grundundersökningar genomförts och gator som har behov av grundförstärkning har identifierats. Metodval för förstärkning

kommer ske i bygghandlingsskedet. I projektets kalkyl har pålning valts för att försäkra sig om att kostnaden täcks in.

Tillstånd enligt miljöbalken

Genomförandearbeten i vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Erfarenhet visar att tillståndprocessen kan ta lång tid. För att minska de tidsrisker som kan uppstå till följd av tillståndsansökan för de utbyggnader i den norra detaljplanen som planeras har kontoret i god tid förberett tillståndprocessen. Ansökan har inskickas till mark- och miljödomstolen april månad 2020, vilket då beräknades vara ett år innan detaljplanens antagande.

Kollektivtrafikförsörjning

Kollektivtrafikens utbyggnad är en viktig förutsättning för en framgångsrik utveckling och utbyggnad av stadsutvecklingsområdet. Hållbarhetsprofilen för området gör att fungerande kollektivtrafik är extra viktig. Region Stockholm har sedan år 2017 utrett hur Norra Djurgårdsstaden ska trafikförsörjas. Ett beslut kring utredningen har skett under hösten 2020. Det saknas formellt beslut kring vilken kollektivtrafiklösning som ska gälla för området samt beslut om hur kollektivtrafiklösning ska finansiering.

Risker för hela projektet Södra Värtan

För hela projektet Södra Värtan dvs. för kommande etapper södra och mellan finns utöver de risker kring grundläggning och tillstånd som beskrivits ovan även risker kring ett antal strategiska frågor. Nedan följer beskrivningar av projektets större risker.

Bangård

För att möjliggöra utbyggnaden av området, enligt detaljplaneförslaget, för områdets mellandel och södra del så krävs att Trafikverkets östra del av Värtabanans bangård avvecklas (benämns Östra bangården).



Bangården utgör idag en barriär mellan Gärdet och den nya stadsdelen i Värtahamnen. Inom den yta där Östra bangården ligger idag planeras Södra Hamnvägen breddas för att kunna hantera god framkomlighet för gång, cykel, kollektivtrafik och kapacitet att stundtals klara stora flöden av fordon till och från Frihamnen.

Avvecklingen är en direkt förutsättning för att detaljplanerna för Södra Värtans södra och mellersta del ska kunna antas med föreslagen struktur. Om bangården inte avvecklas krävs att detaljplaneförslaget i södra och mellersta delen görs om. Exploateringen i området bedöms bli betydligt lägre. Avvecklingen är också viktig för hur projektet Valparaiso i Värtahamnen kan utformas. Avvecklingen innebär att Södra Hamnvägen kan breddas och är även viktig för hamnens utveckling och tillgängligheten till projektområdena i Loudden och Frihamnen inom Norra Djurgårdsstaden. Om bangården avvecklas finns också en möjlighet att på längre sikt kunna exploatera mark intill Tegelluddsvägen.

Sedan år 2013 har staden bedrivit ett gemensamt arbete med Trafikverket för att hitta en lämplig lösning för att kunna ersätta den järnvägskapacitet som försvinner om den Östra bangården läggs ned. Flera olika utredningsalternativ har prövats. Det alternativ som Trafikverket accepterar är att den Västra bangården byggs om och utökas med ett ytterligare spår.

Det femte spåret behöver placeras söder om befintliga spår på Västra bangården och inkräktar därmed på Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) mark samt deras arrendator Kungliga Tennisklubben (KLTK) byggnader. KDF har under

hösten 2020 återupptagit ett tidigare avstannat arbete med detaljplan för idrottsändamål, projektet benämns Storängsbotten. I detaljplaneförslaget föreslås nya placeringar kring delar av de funktioner som kan påverkas av ett femte spår. En större del av förslaget utbyggnadsområde kan dock påverkas av den riksintresseprecisering som Trafikverket föreslår för Östlig förbindelse. Om riksintressepreciseringen kommer gälla, enligt remitterat material våren 2020, kommer flera byggnader inte kunna ges permanent stöd i detaljplan. Ett arbete pågår med Trafikverket för att ytterligare bedöma vad som är genomförbart. Slutligt besked kring riksintressepreciseringen väntas kring sommaren 2021 från Trafikverket. Ombyggnaden av bangården bedöms inte påverkas av eventuellt riksintressepreciseringsområde.

Avvecklingen av den Östra bangården kräver ett beslut från Trafikverkets styrelse kring avveckling. Eventuellt krävs även ett regeringsbeslut. Ombyggnationen av ett femte spår vid den Västra bangården kräver en järnvägsplan. Staden har tecknat ett avtal med Trafikverket gällande att en järnvägsplan ska tas fram. Järnvägsplan ska påbörjas under kvartal 1 år 2021 och beräknas klar till kvartal 1 år 2024.

Järnvägsplanen kommer villkora avvecklingsbeslutet av den Östra bangården samt antaganden av detaljplanerna för de södra och mellersta delarna av Södra Värtan.

Stadens finansiering av ombyggnaden av bangården planeras ske genom det genomförandebeslut som ska fattas för Södra Värtans södra detaljplan. Enligt Lagen om byggande av järnväg behöver ombyggnad av järnvägen påbörjas inom fem år efter järnvägsplanen fastställts. Det är därmed viktigt att tidplaner för detaljplan och järnvägsplan följs åt. Ett arbete pågår med att bedöma hur riskerna ska hanteras och hur riskminimering ska ske i det genomförandeval som ska tecknas mellan Trafikverket och staden.

Arbetet med att avveckla den Östra bangården har pågått under mycket lång tid och alla parter är väl insatta i projektet och samarbetar i frågan. En gemensam styrgrupp mellan Trafikverket och staden är tillsatt.

Konjunkturförändringar

Projektet kommer att byggas under flera år och i olika etapper, vilket medför att olika ekonomiska förutsättningar kan komma att råda vid olika tidpunkter. Exploateringskontoret kommer arbeta för en flexibilitet i utbyggnaden av området som sker etappvis, för att parera och till viss del anpassas till eventuella konjunkturcykler på marknaden.

Buller

Bullret från fartygen ställer särskilda krav på byggnader samt utbyggnadsordning av projektet. Inom den norra detaljplanen i Södra Värtan har bullerproblematiken hanterats där planbestämmelser ställer särskilda krav. Avtalsservitut gällande att fastigheten belastas med bullerstörning kommer tecknas vid den mark som säljs i den norra etappen. För fastigheter som upplåts med tomträtt kommer bullerstörningen skrivas in i tomträttsupplåtelsen. Vikten av att anpassa bebyggelsen till fartygsbullret kommer också att lyftas fram särskilt i aktuella exploateringsöverenskommelser.

För de kommande etapperna södra och mellersta delarna i Södra Värtan återstår ett fortsatt arbete med att utreda hur byggnader ska kunna hantera buller från hamnverksamheten. Då bostäder planeras i delar av södra och mellersta området ställs andra krav kring tillåtna bullernivåer än vid kommersiell bebyggelse. Osäkerheter kring om delar av planerad bostadsbebyggelse inom Södra Värtans mellersta del kan uppföras behöver fortsatt hanteras i investeringskalkyler för projektet Södra Värtan.

Tidsrisker

Projektet är stort och komplext där risker finns för tidsförskjutningar. Tidsmässiga förskjutningar får stora konsekvenser på den totala slutkostnaden för ett sådant här stort projekt med lång genomförandetid och omfattande utgifter. För att minska risker kring tidsförskjutningar har projektet genomfört ett antal genomförandeåtgärder, bland annat ombyggnaden av Södra Kajen, där en investering bedömdes behövas ske då kajen var i så pass dåligt skick. I intilliggande projekt har delar av en ny väg, Hamnpirsvägen, byggts för att minska genomförandetiden. Genom att detaljplanen för Södra Värtans norra del antas och genomförandet har påbörjats tidigare än resterande delar i Södra Värtan, har tidsrisken för hela Södra Värtan minskat mot förra beslutstillfället. För staden innebär detta en jämnare

produktionstakt och möjliggör en mindre risk med tidsförskjutning i projektet.

Kommunikation

Parter som är delaktiga i utbyggnadsförslaget utöver exploateringskontoret är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, SISAB, STOKAB, Skanova, Ellevio, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Gasnätet i Stockholm, Stockholms hamnar och Östermalms stadsförvaltning.

Beslut om uppförande av en skola med tillhörande gymnastiksal avses fattas av utbildningsförvaltningen om fortsatt planarbete påvisar att det kan möjliggöras. SISAB har på uppdrag av utbildningsförvaltningen påbörjat en tidig utredning för uppförande av skola i Södra Värtans mellandel.

Östermalms stadsdelsförvaltning har uttryckt behov av bostäder i projektet till vissa funktionshindre enligt Lagen om stöd och service (LSS) och med hänsyn till Socialtjänstlagen (SoL) som planeras uppföras i Södra Värtans mellandel. Antalet förskoleavdelningar beräknas enligt stadsdelsförvaltningen uppgå till totalt 20 stycken i Södra Värtans södra och mellandel.

I samband med att detta ärende skickas till exploateringsnämnden sänds det också ut till ledamöterna i Östermalms stadsdelsnämnd.

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med stadsledningskontoret. Projektets intäkter, utgifter, tidplan, planerad bebyggelse och exploateringsöverenskommelser, uppfyllelse av mål och risker har genomgått baserat på upprättad nuvärdekalkyl, föreliggande tjänsteutlåtande samt detaljplaneförslaget.

Kontorets sammanfattande bedömning

Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 omfattande investeringsutgifter om 981 mnkr och investeringsinkomster om 15 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Niam VI Neapel 3 AB avseende tomträtten Neapel 3 samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse om exploatering träffas och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Exploateringsnämnden godkänner partsbyte för markanvisningen inom fastigheten Hangö 1 mellan Niam VI Neapel 3 AB och Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Exploateringsnämnden godkänner för sin del försäljning av mark inom fastigheterna Hangö 1, Ladugårdsgärdet 1:9, Ladugårdsgärdet 1:40 och Neapel 3 till Niam VI Neapel 3 AB, Niam VII Norra Djurgårdsstaden AB och Bonnier Fastigheter AB med en försäljningsinkomst om cirka 796 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa erforderliga avtal enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Slut

Bilagor

1. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal
