Hökarängsskolan

Hierarki	Kod	Beskrivning	Varaktighet
1		**Utredning**	**80 d**
2		**Utredning UtbF/skola**	**184 d**
3		**Kalkyl Offert**	**22 d**
4		**Inriktningsbeslut**	**36 d**
5		**Förslagshandling**	**63 d**
6		**Förslagshandling**	**102 d**
7		**Kalkyl/Offert**	**63 d**
8		**Genomförandebeslut**	**64 d**
9		**Projektering**	**151 d**
10		**Bygglovsansökan**	**41 d**
11		**Upphandling Skede 1**	**57 d**
12		**Avtal skede 1**	
13		**Kalkyl målpris**	**47 d**
14		**Avtal skede 2**	
15		**Produktion**	**544 d**
15.1		**Markarbeten Hus C-D**	**86 d**
15.2		**Gymnastik förbereds för matsal**	**23 d**
15.3		**Evakuering Hus D och A (högstadiet)**	**42 d**
15.4		**Hus D**	**382 d**
15.5		**Evakuering Hus C till Hus A**	**42 d**
15.6		**Hus C**	**230 d**
15.7		**Inflytt Hus C**	**29 d**
15.8		**Evakuering hus A och B till**	**43 d**
15.9		**Hus B**	**238 d**
15.10		**Hus A**	**237 d**
15.11		**Inflytt Hus A och B**	**30 d**
15.12		**Paviljong**	**284 d**

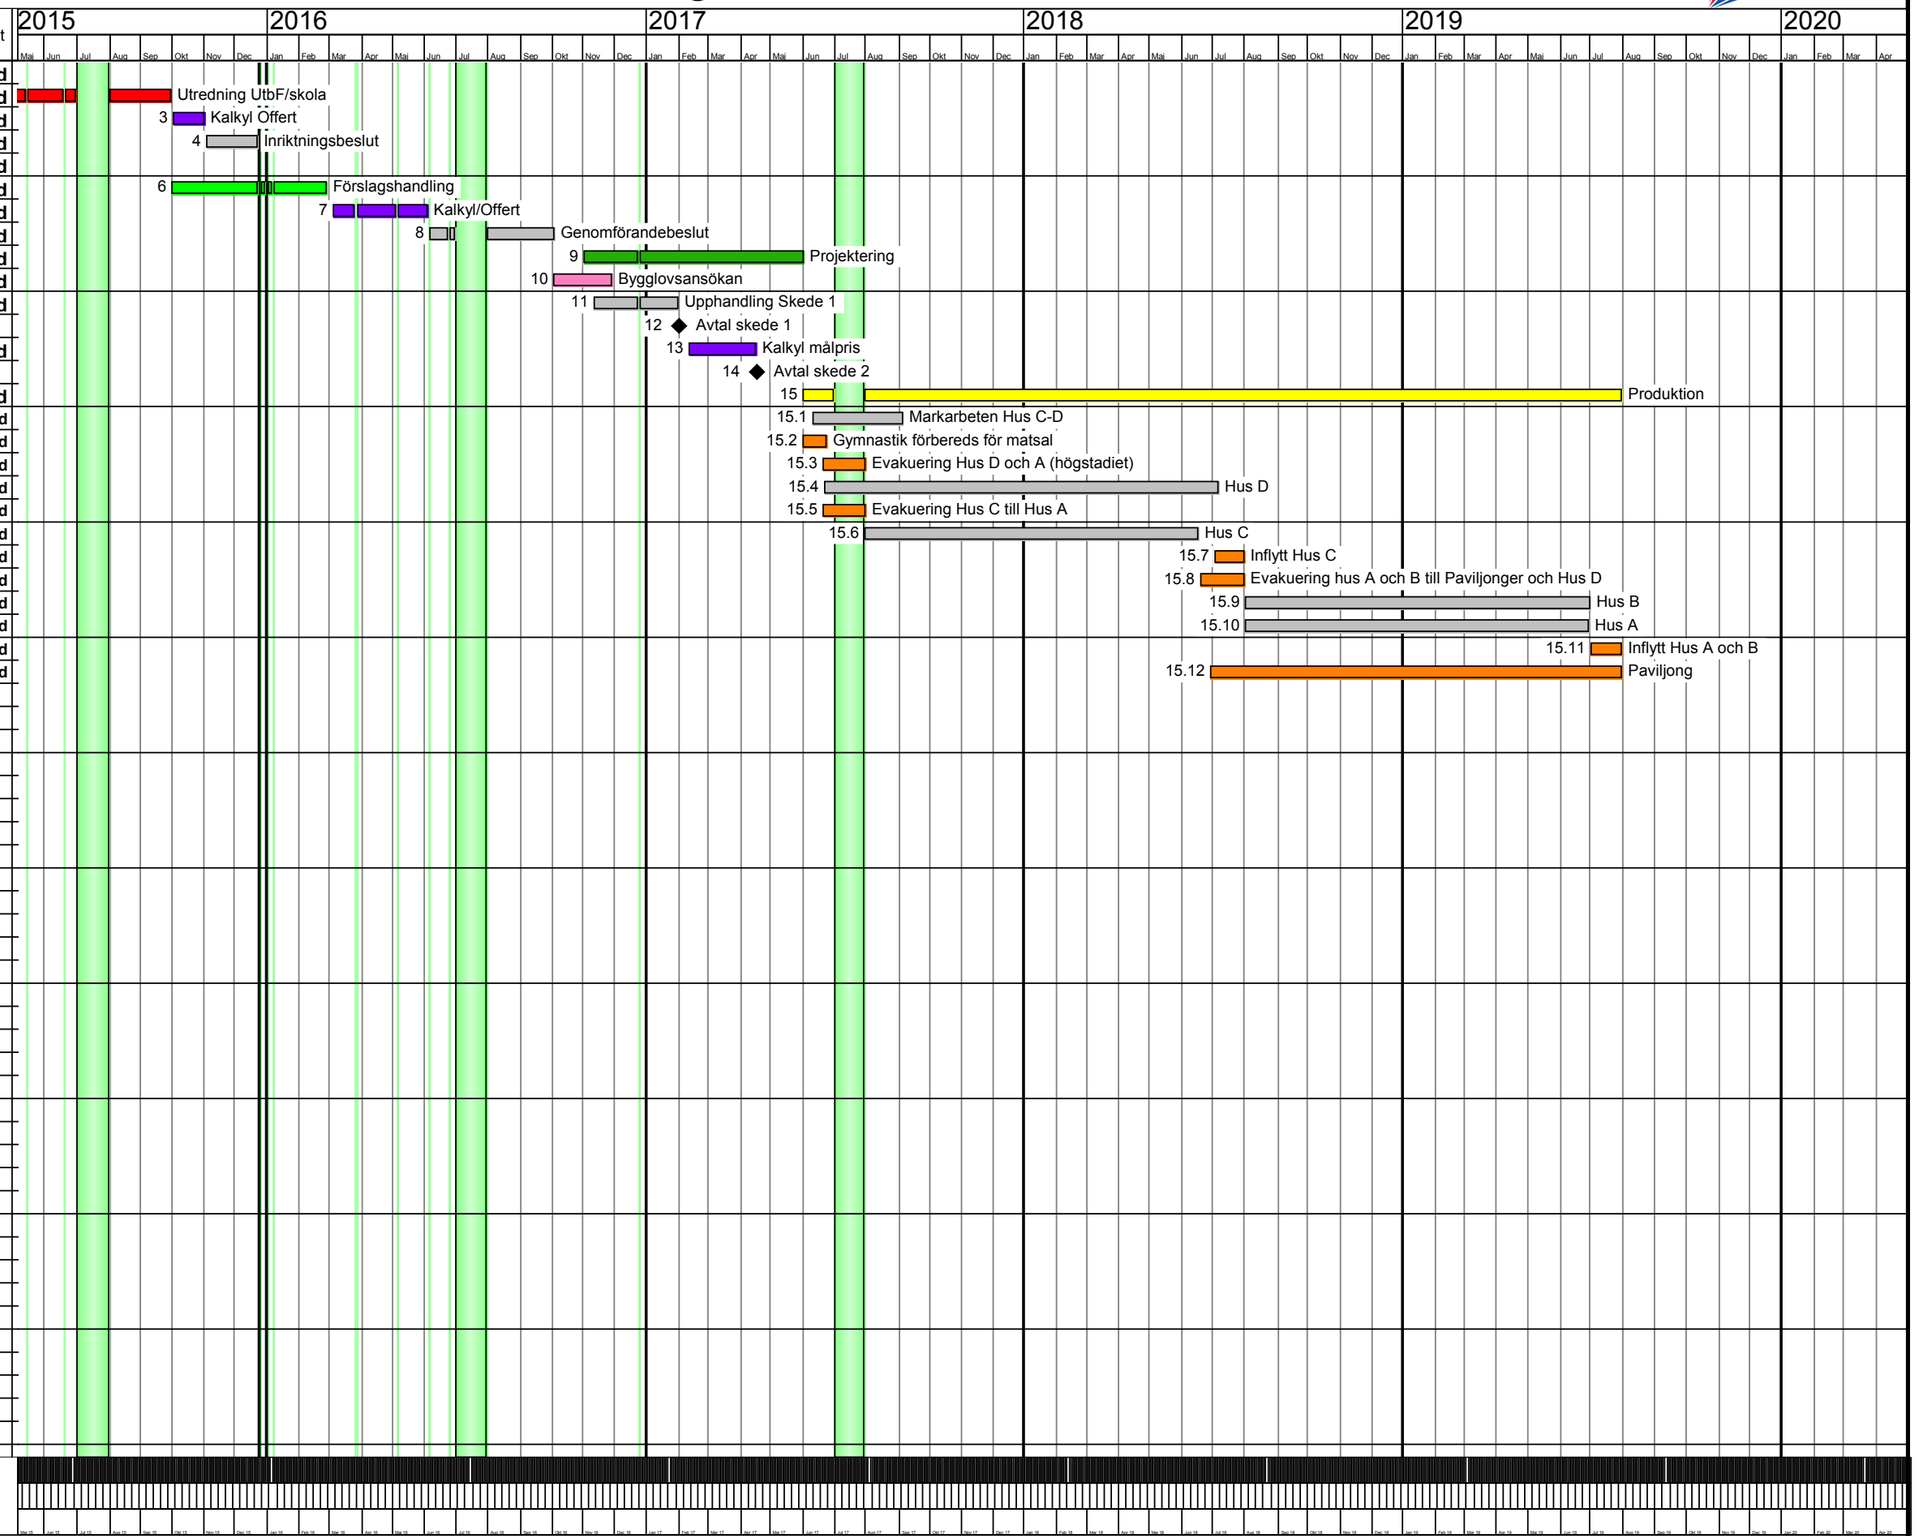

Projektledare: Anders Ehnlund
Projektplanerare:
PlanCon 6.4.1

Projekttidplan
Sida 1/1

Upprättad: 2015-06-16
Reviderad: 2016-11-07
WSP
